


# 工事進捗状況写真 (平成21年3月施工)



▲全景(南側より)

平成21年3月30日 撮影

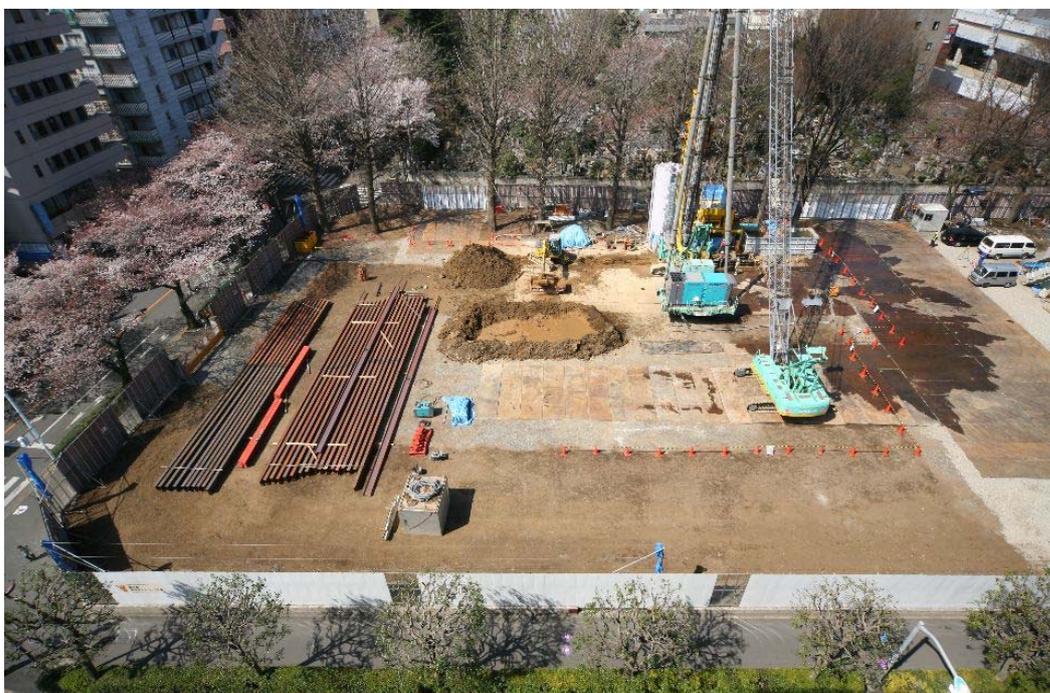

▲全景(東側より)

平成21年3月30日 撮影



▲全景(北側より)

平成21年3月30日 撮影

- 仮囲いや現場事務所などの仮設物が建ちあがり、いよいよ本格的な工事に移っています。
- 写真は大型重機で、「山留め壁」を設置しているところです。(SMW工法で施工)
- 武蔵野プレイスの建設では、地下部分が大きく、深さ17m超まで掘削します。この時に周囲の土が崩れないように設置するものが「山留め壁」です。
- 直径65cm程度の穴を掘り、鉄骨とコンクリートで止水を兼ねた「山留め壁」を設置しています。
- この工事を5月上旬まで行います。
