



ステップ1 令和4年2月頃～8月頃

(仮設校舎 建設)

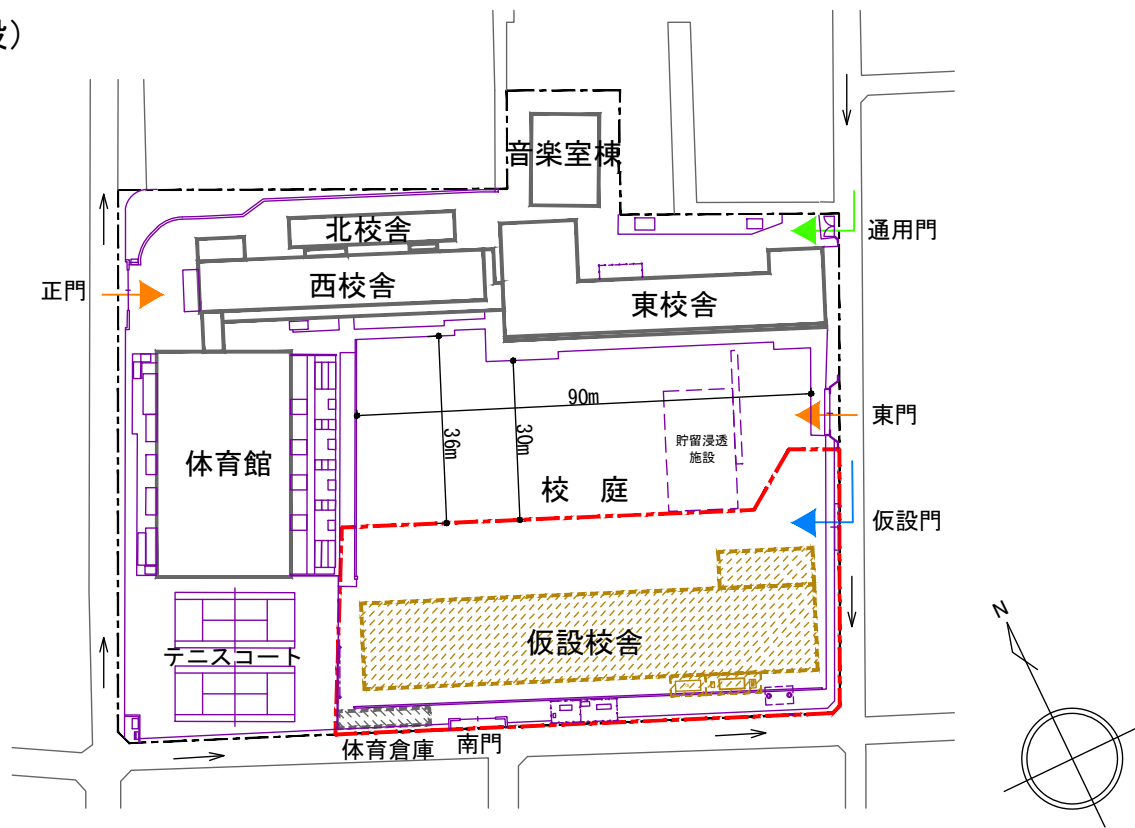


ステップ2 令和4年9月頃～令和5年6月頃

(旧(東西北)校舎 解体)

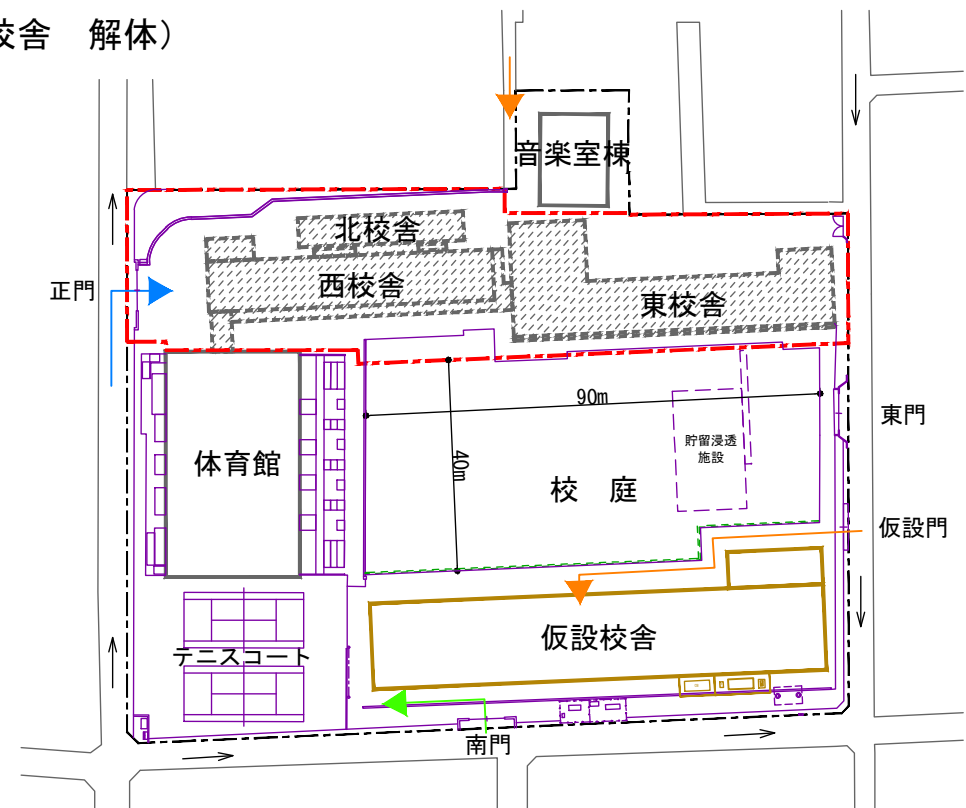


ステップ3 令和5年7月頃～令和7年1月頃

(新校舎・新体育館 建設)

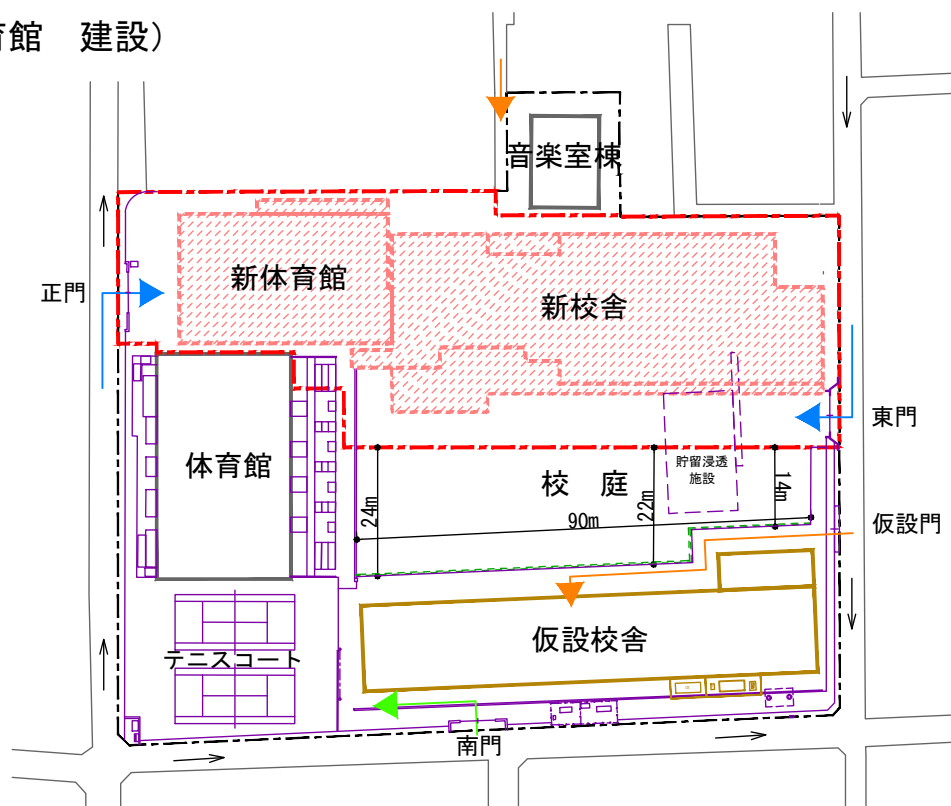

ステップ4 令和7年4月頃～令和9年12月頃

(新校舎完成 (小学校・中学校共同利用))

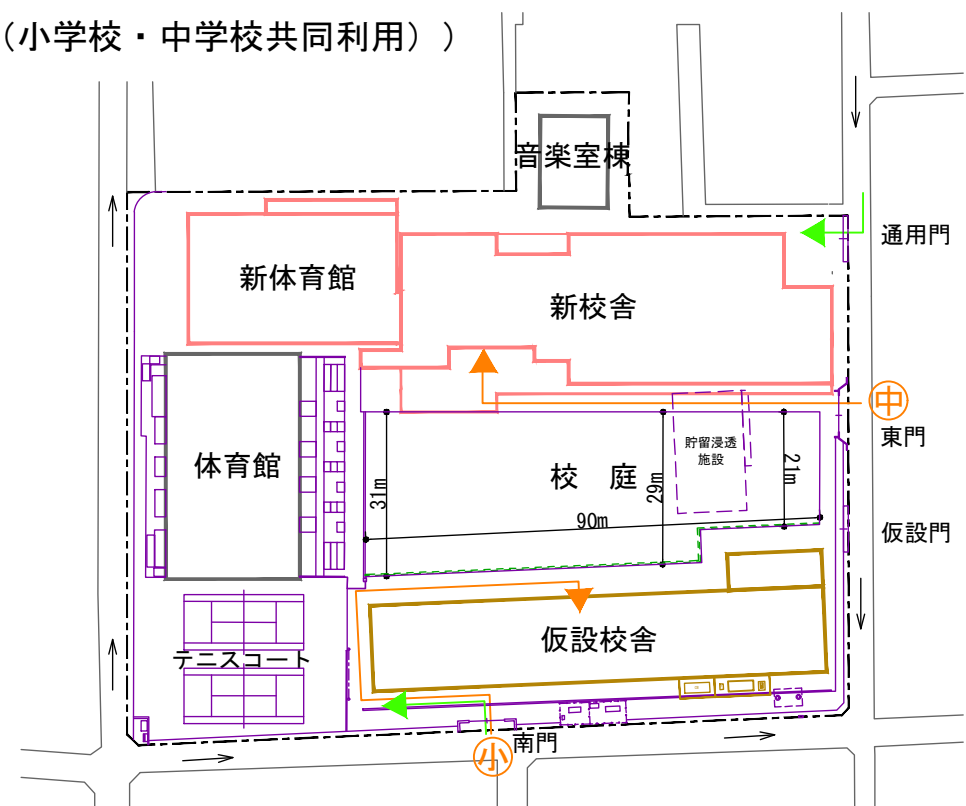


凡例	— 既設	--- 建物等の点線表示は工事中を示す。	← 動線 (学校)
	- - - 仮設	--- 既存外構物を示す。	← 動線 (工事車両)
	— 新設	--- 仮設側溝を示す。	← 動線 (給食車両)
	- - - 仮囲		

現時点での想定です。

ステップ5-1

令和10年1月頃～令和11年3月頃


(旧体育館・仮設校舎 解体)

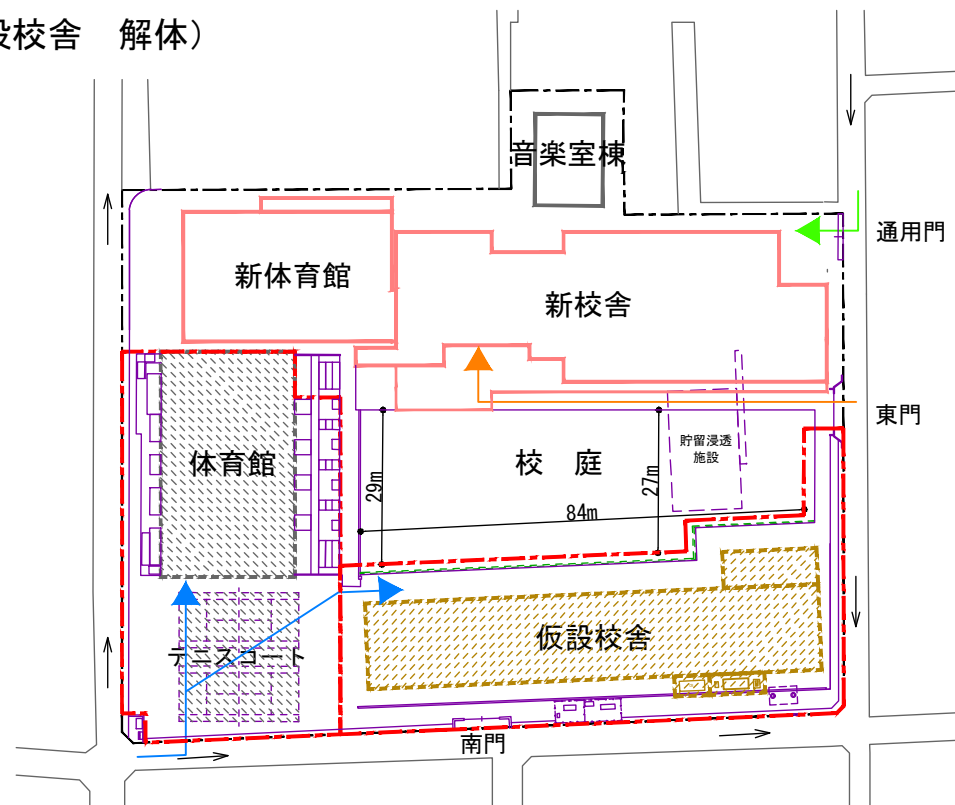

ステップ5-2


令和10年12月頃～令和11年8月頃

(外構工事 (プール・テニスコート整備含む))

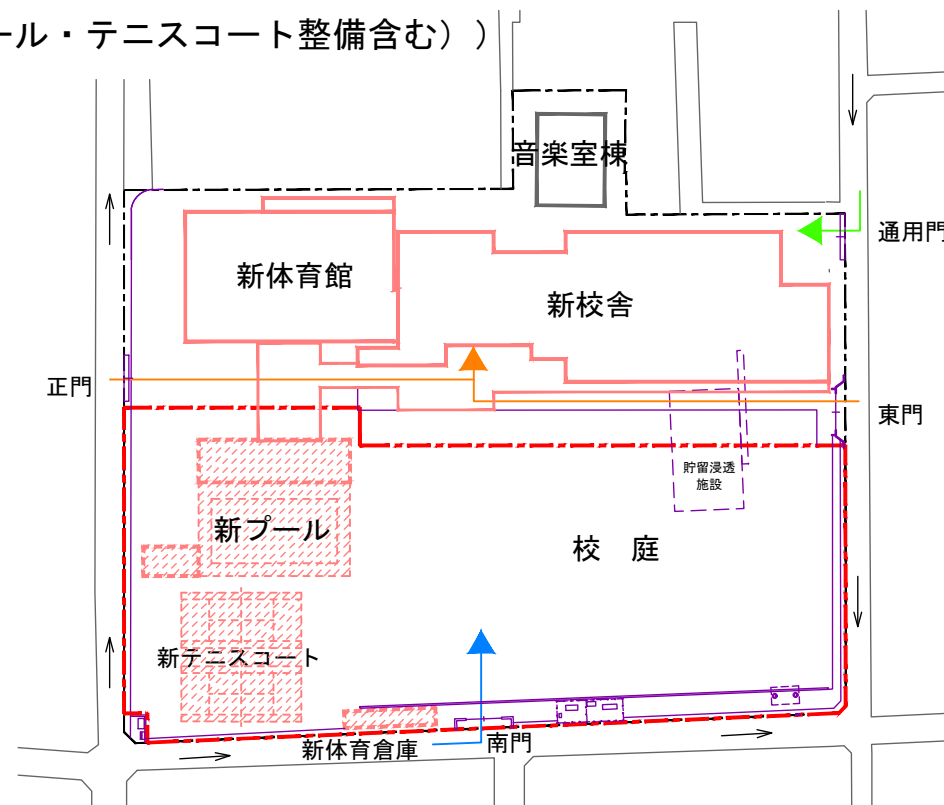

完成

令和11年9月頃

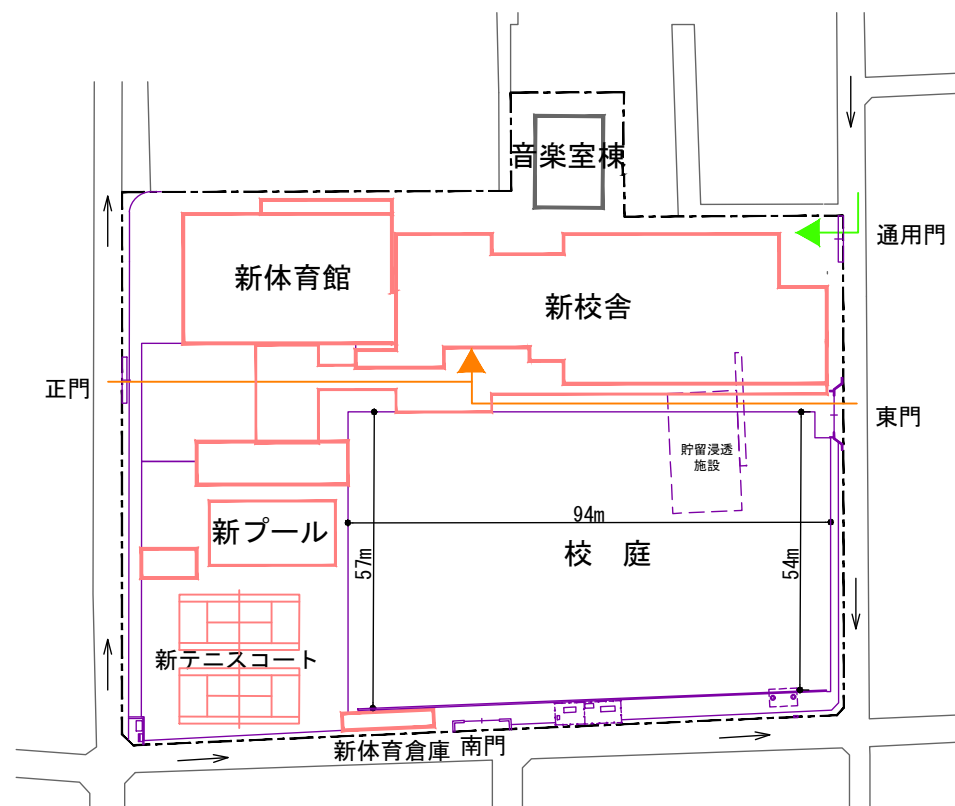

凡例	— 既設	----- 建物等の点線表示は工事中を示す。	← 動線 (学校)
	— 仮設	----- 既存外構物を示す。	← 動線 (工事車両)
	— 新設	----- 仮設側溝を示す。	← 動線 (給食車両)
	— 仮囲		

現時点での想定です。
