



ステップ1 令和4年2月頃～8月頃

(仮設校舎1 建設)

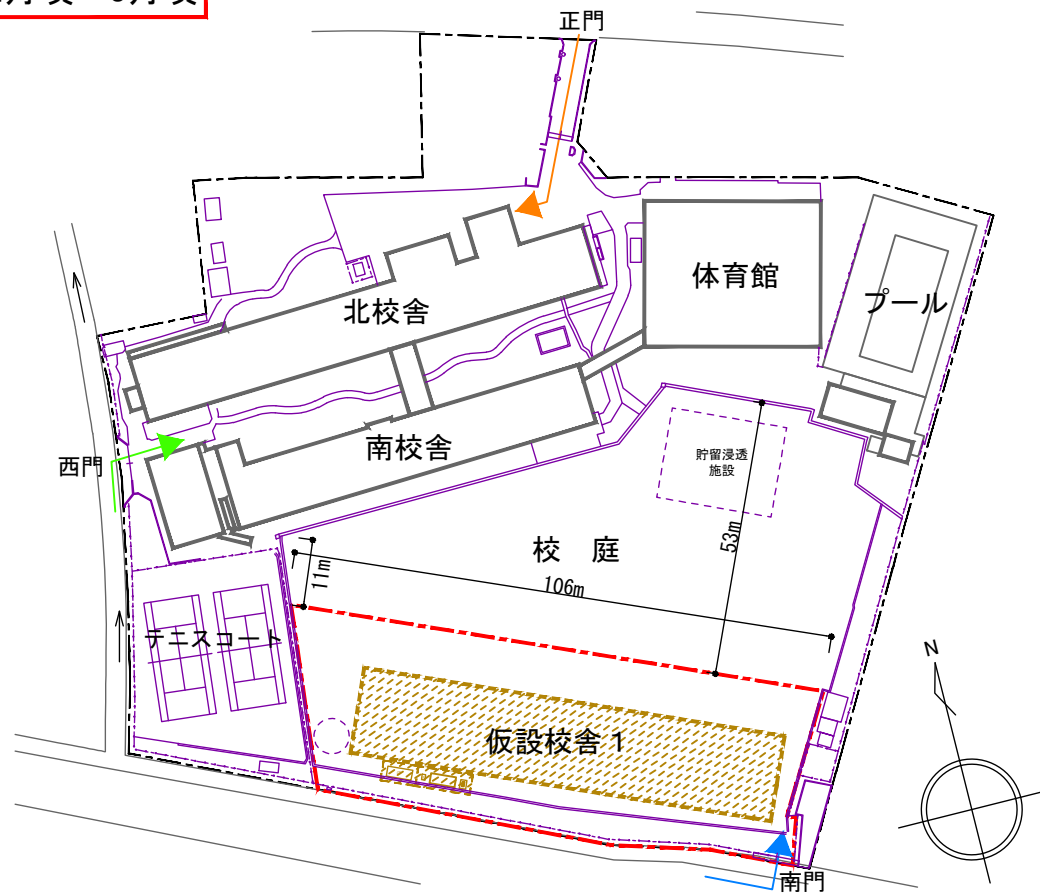

ステップ2 令和4年9月頃～令和5年6月頃

(旧(南北)校舎 解体)

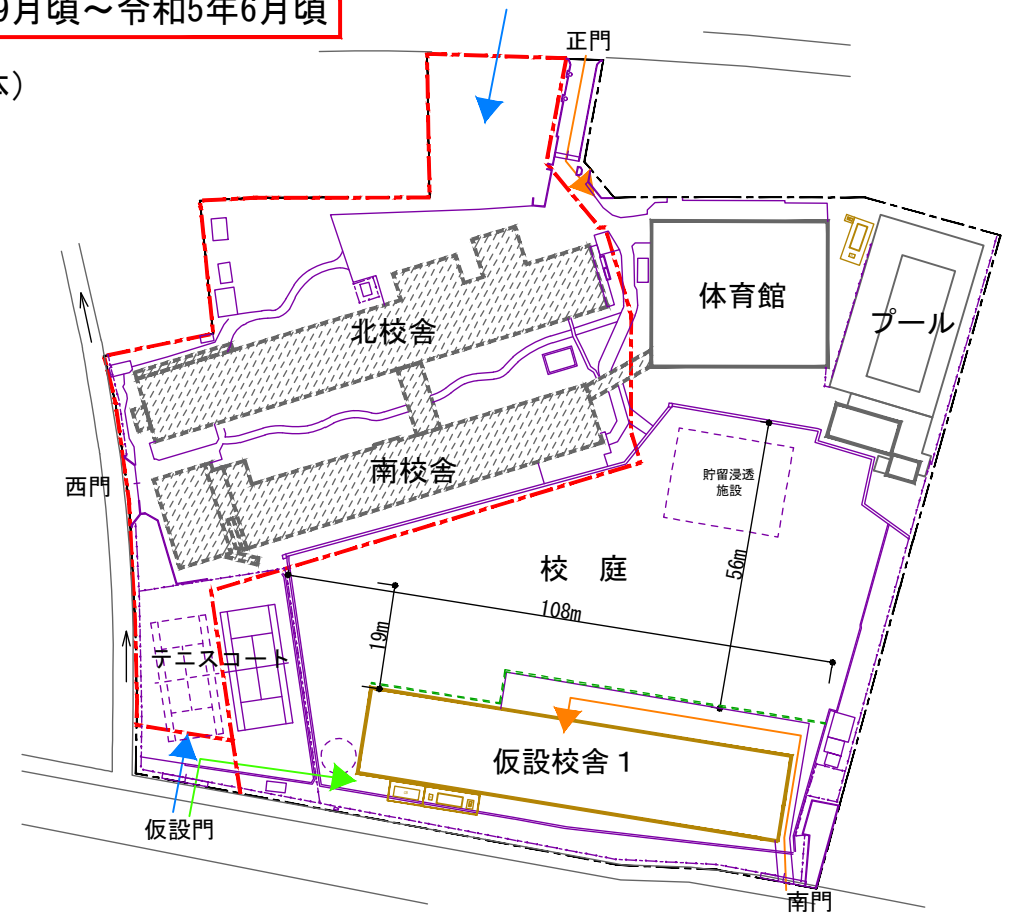


ステップ3-1 令和5年7月頃～令和7年1月頃

(新校舎・新体育館 建設)



ステップ3-2 令和7年2月頃～令和7年3月頃

(仮設校舎2 建設)

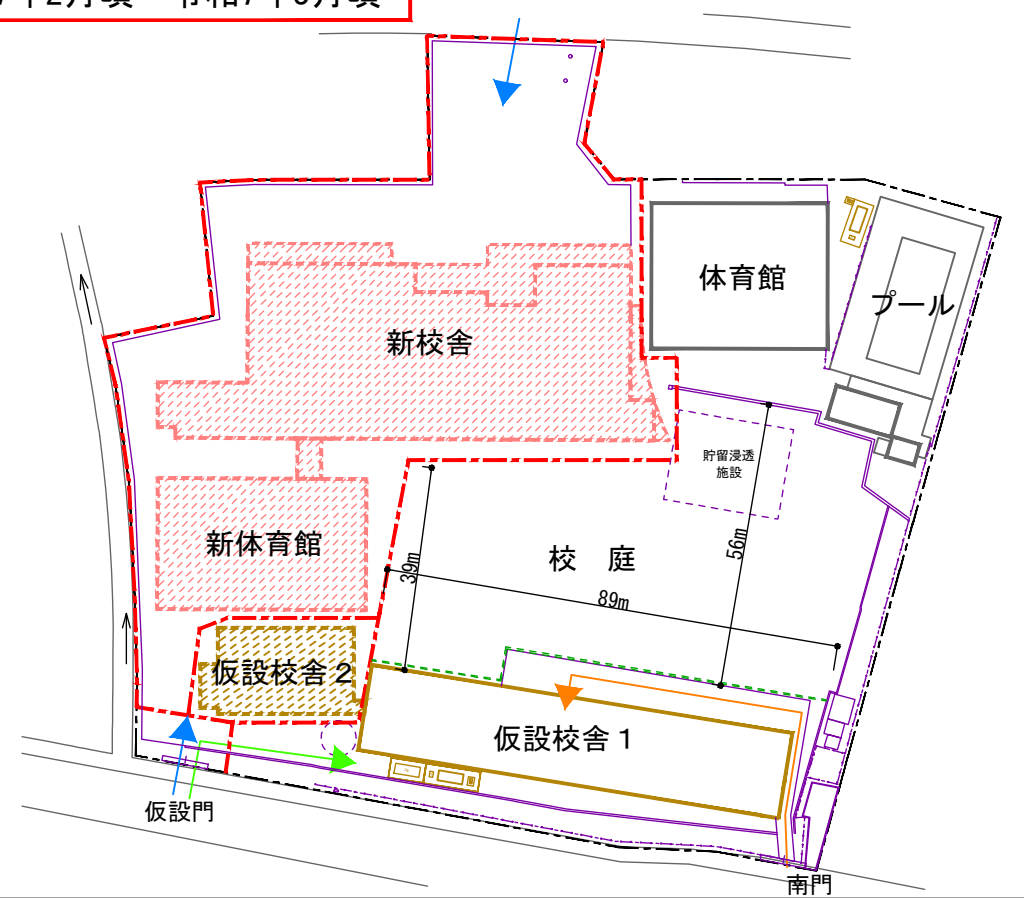


凡例	— 既設	--- 建物等の点線表示は工事中を示す。	← 動線 (学校)
	--- 仮設	--- 既存外構物を示す。	← 動線 (工事車両)
	--- 新設	--- 仮設側溝を示す。	← 動線 (給食車両)
	--- 仮囲		

現時点での想定です。


ステップ4 令和7年4月頃～令和9年12月頃

(新校舎完成 (小学校・中学校共同利用))

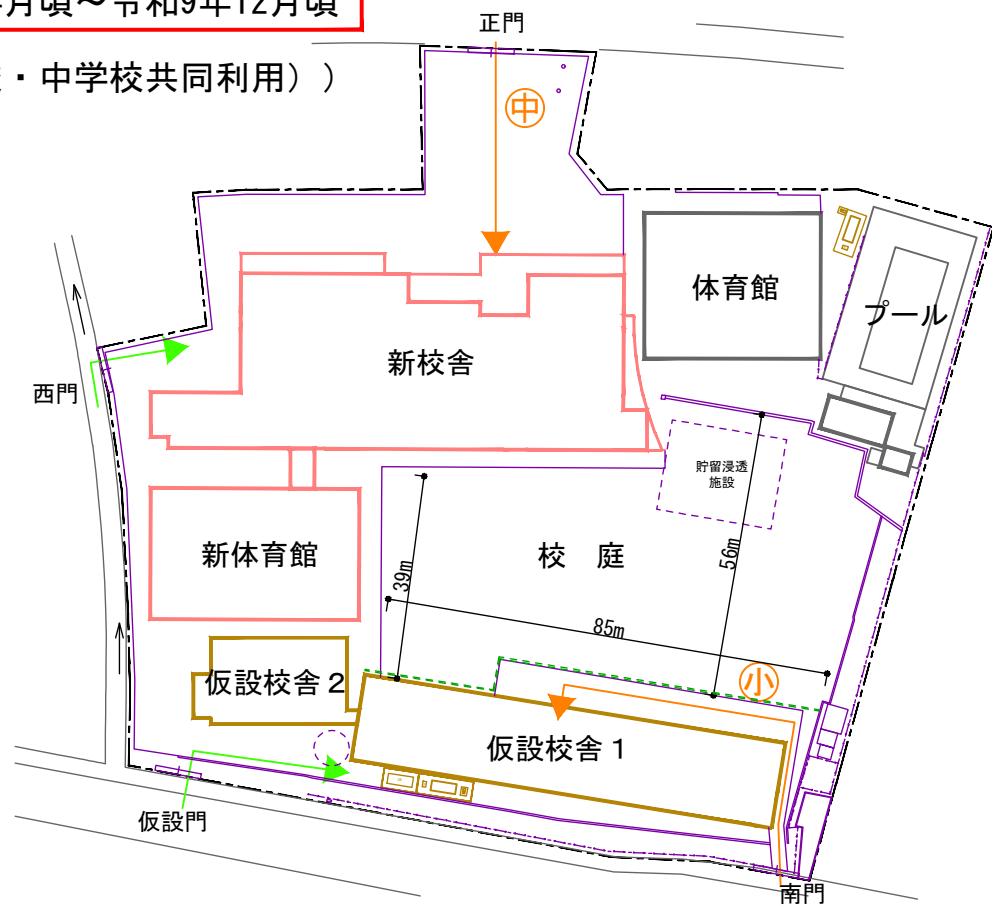


ステップ5-1 令和10年1月頃～令和10年7月頃

(旧体育館・旧プール 解体)

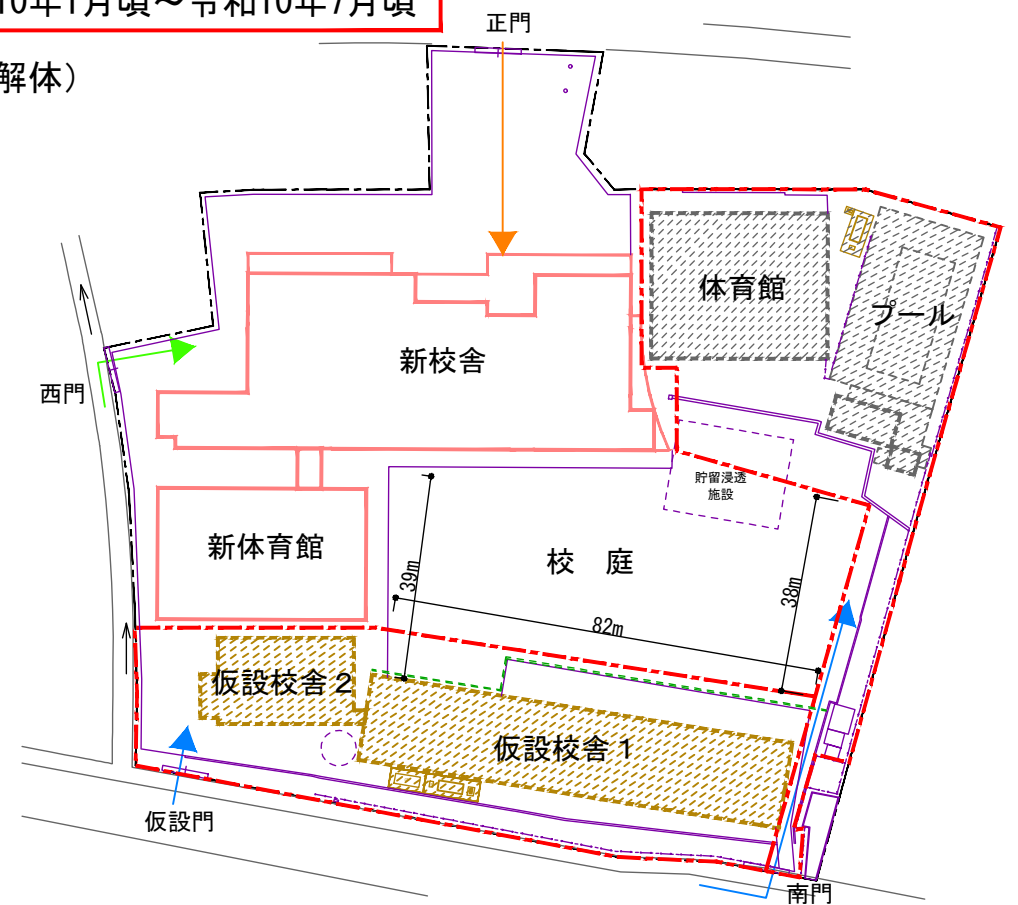


ステップ5-2 令和10年4月頃～令和11年3月頃

(外構工事 (プール含む))

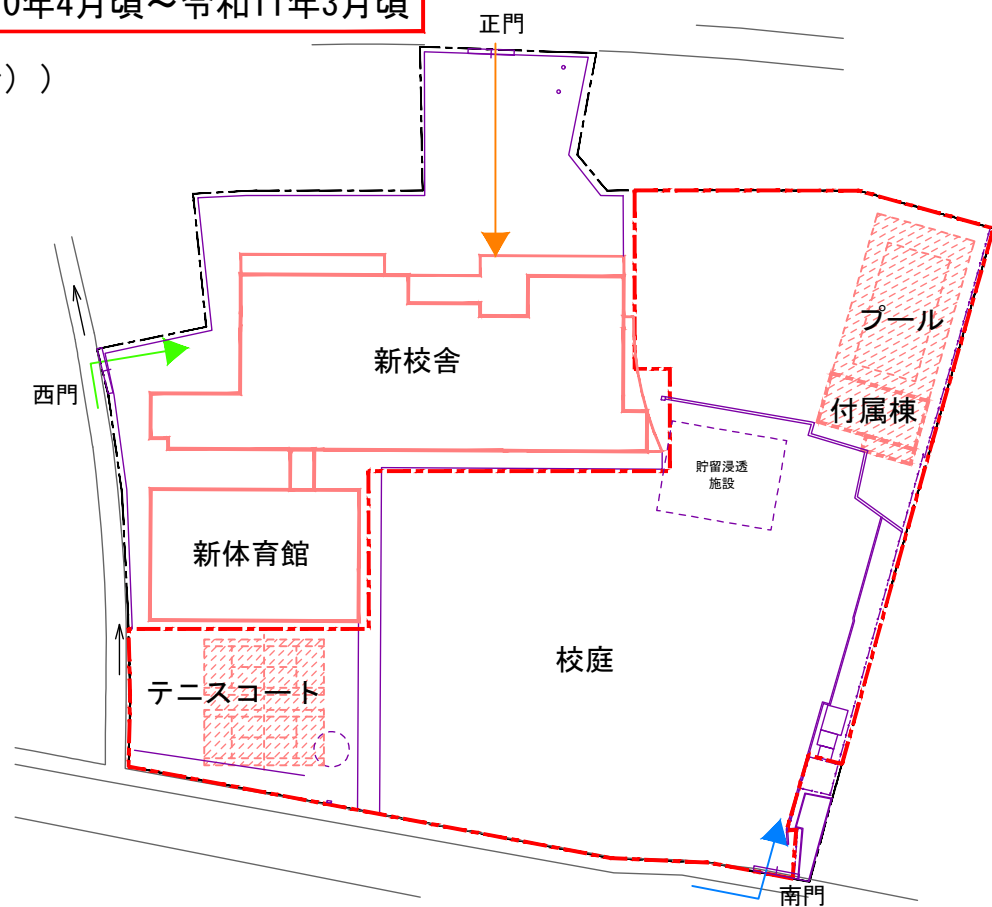

完成 令和11年4月頃

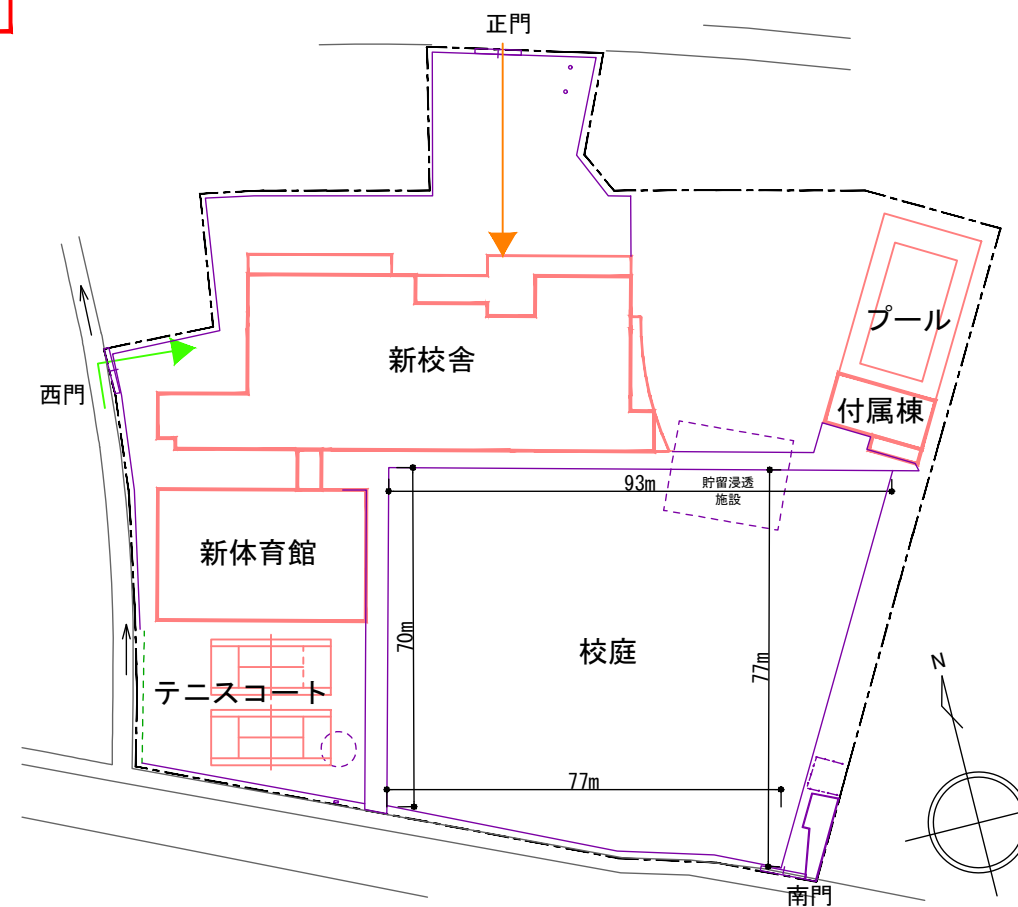

凡例	— 既設	- - - 建物等の点線表示は工事中を示す。	← 動線 (学校)
	— 仮設	- - - 既存外構物を示す。	← 動線 (工事車両)
	— 新設	- - - 仮設側溝を示す。	← 動線 (給食車両)
	— 仮囲		

現時点での想定です。
