



第一中学校・井之頭小学校 改築工事スケジュール変更に関 する説明会

- ・ 令和5年7月7日（金）午後6時30分～7時30分、第一中学校体育館
- ・ 令和5年7月8日（土）午前10時～11時、井之頭小学校体育館
- ・ 令和5年7月8日（土）午後2時30分～3時30分、中央図書館3階視聴覚ホール
- ・ 令和5年7月10日（月）午後6時30分～7時30分、井之頭小学校体育館

武蔵野市教育企画課

本日の内容

- 1 入札結果と工事着手の遅れについて
- 2 第一中学校改築工事スケジュールの変更について
- 3 井之頭小学校改築工事スケジュールの変更について
- 4 工事ステップについて
- 5 関係する生徒・児童について



1 入札結果と工事着手の遅れについて



(1) 第一中学校改築工事 当初予定工期

- 工事予定期間

令和5年7月から令和7年1月末日まで(19か月)

- 当初新校舎開始予定

令和7年4月(令和7年度1学期)から



(2) 入札結果について

不調

入札状況

○入札方式 総合評価方式(施工実績評価型)

○スケジュール

・告示日 令和5年1月30日

・入札締め切り 令和5年4月4日

⇒ 1事業者の参加があったが、応札されなかった。



(3) 不調原因

- ・昨今の社会情勢の影響による「工事費」及び「工事工期」

(4) 再入札に向けて

- ・不調を起こさない対策
- ・スケジュール

第2回市議会定例会(令和5年6月)

⇒ 令和5年度補正予算及び債務負担行為補正

令和5年8月 再入札

第3回市議会定例会(令和5年9月)

⇒ 工事請負契約



2 第一中学校改築工事 スケジュール変更について

(1) 概要

- 工事予定期間
令和5年10月～7年10月末
(25か月)
- 引越作業等
令和7年11月～12月
- 新校舎使用開始
令和8年1月
(令和7年度3学期から)



鳥瞰図(南西側上空からのイメージ)

(2) 変更後スケジュール

① 当初スケジュール

	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
設計	基本計画	基本設計	実施設計	7月	1月		
工事			解体工事	新築工事 19か月			
生徒の 通学先	第一中 既存校舎		第一中敷地内の仮設校舎			第一中 新校舎	



② 変更後スケジュール

	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	
設計	基本計画	基本設計	実施設計	★入札不調				
工事			解体工事	10月	新築工事 25か月	10月		
生徒の 通学先	第一中 既存校舎		第一中敷地内の仮設校舎				1月	第一中 新校舎



(3) 車両搬入経路



至 井の頭通り

◆ 工事車両搬入口

- ① メインゲート
- ② サブゲート

◆ ゾーン30範囲内

(時速30キロ速度制限)

◆ 工事車両通行不可

- ① 7:00 ~ 9:00
17:00 ~ 19:00
- ② 7:00 ~ 9:00
14:00 ~ 16:00



3 井之頭小学校改築工事 スケジュールの変更について

(1) 概要

当初

- ・予定工期
令和7年度～9年度(令和7年4月～)
- ・新校舎使用開始(予定)
令和10年4月(令和10年度1学期から)

変更後

- ・予定工期
令和8年度～10年度(令和8年4月～)
- ・新校舎使用開始(予定)
令和11年4月(令和11年度1学期から)



(2) 変更後のスケジュール

① 当初スケジュール

	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度～
設計	基本計画	基本設計	実施設計					
工事				解体工事	新築工事			
児童の通学先	井之頭小 既存校舎			第一中敷地内の仮設校舎			井之頭小 新校舎	



② 変更後スケジュール

	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度～
設計	基本計画	基本設計	実施設計					
工事					解体工事	新築工事		
児童の通学先	井之頭小 既存校舎				第一中敷地内の仮設校舎			井之頭小 新校舎






4 工事ステップについて

工事ステップ


年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
	2020	2021	2022	2023
変更後 ステップ			8月 (9月) ステップ1	9月 10月 ステップ2

第一中学校

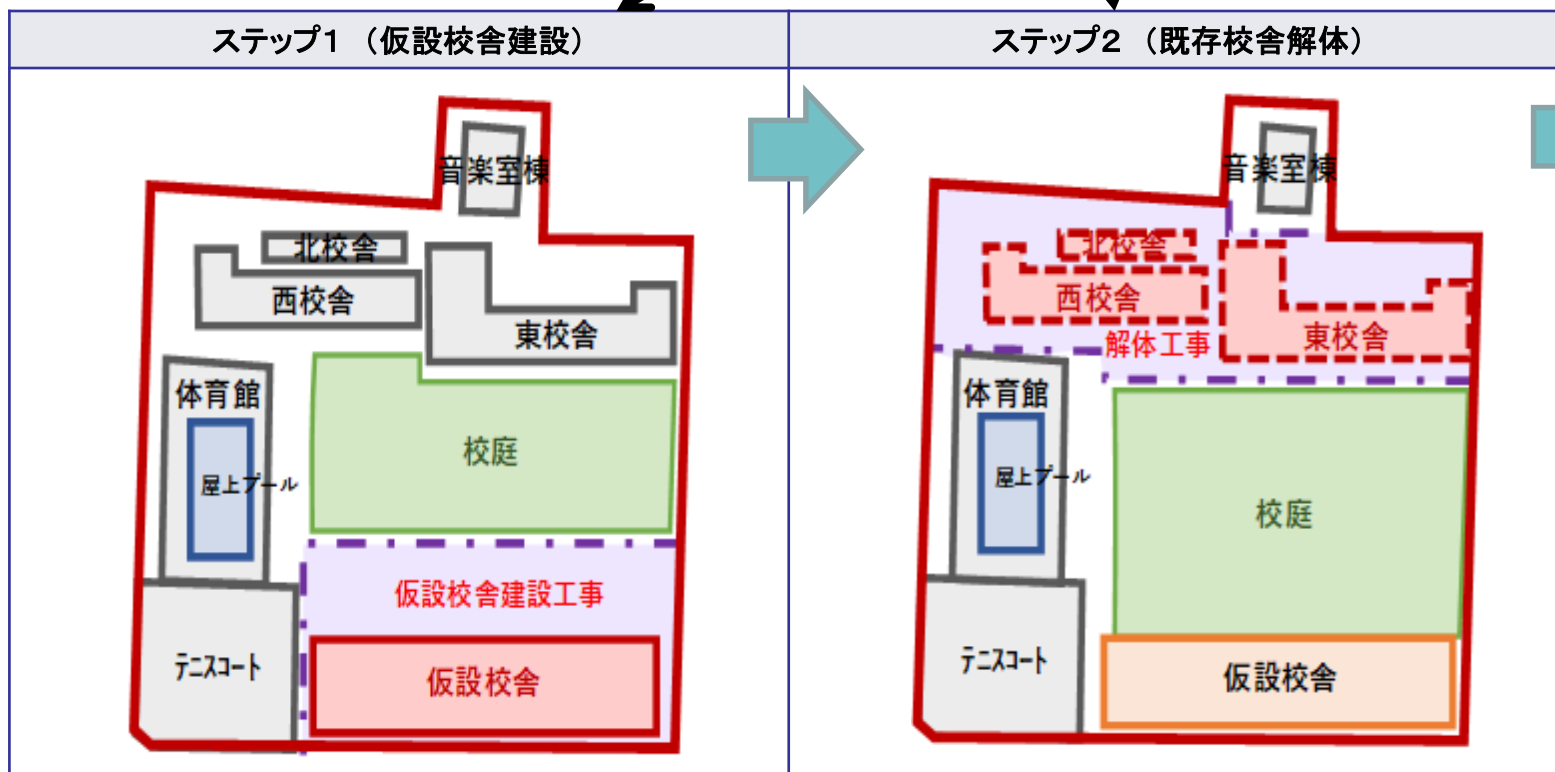


工事ステップ

令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
2023	2024	2025	2026	2027	2028
9月	10月	10月			
ステップ2	ステップ3		ステップ4		

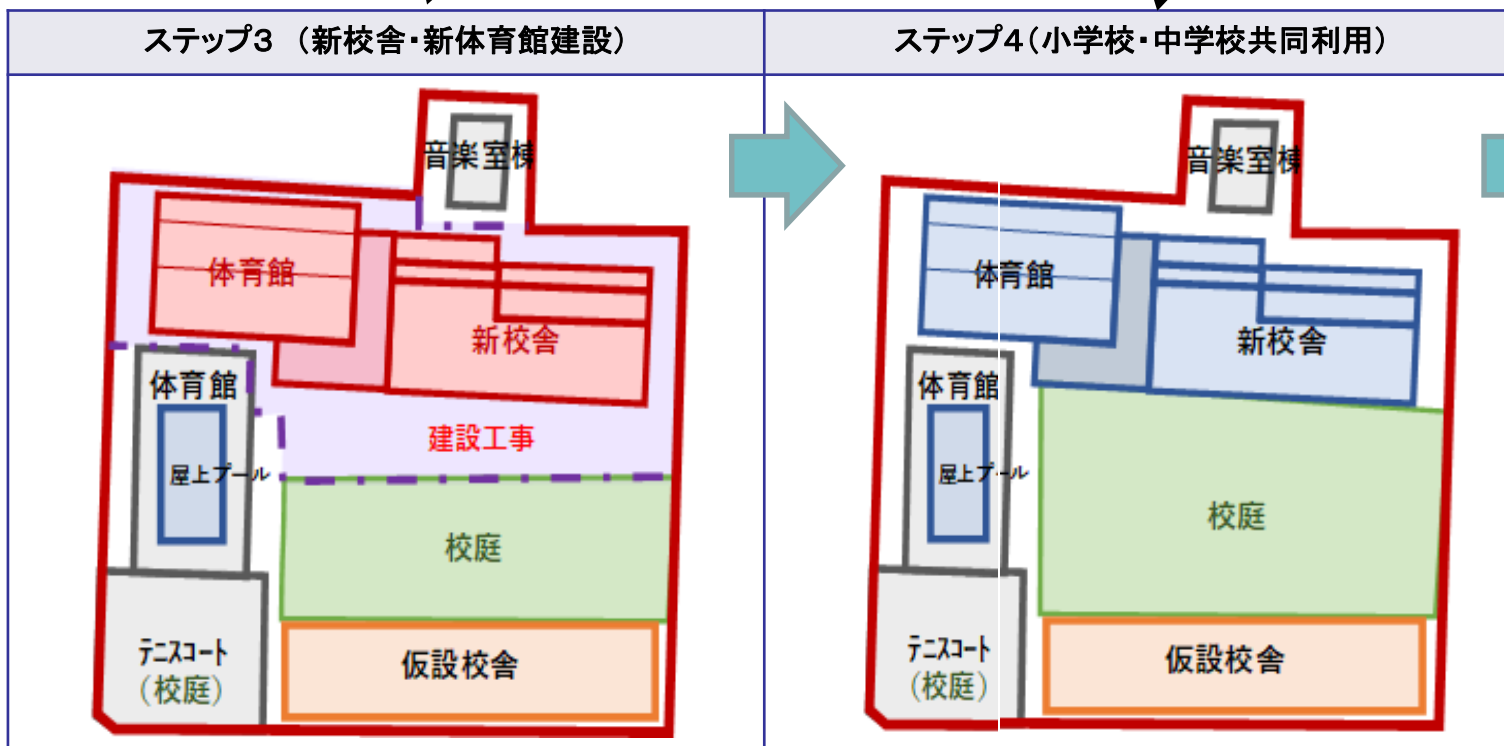

工事ステップ

令和10年度	令和11年度	令和12年度
2028	2029	2030
	ステップ5	

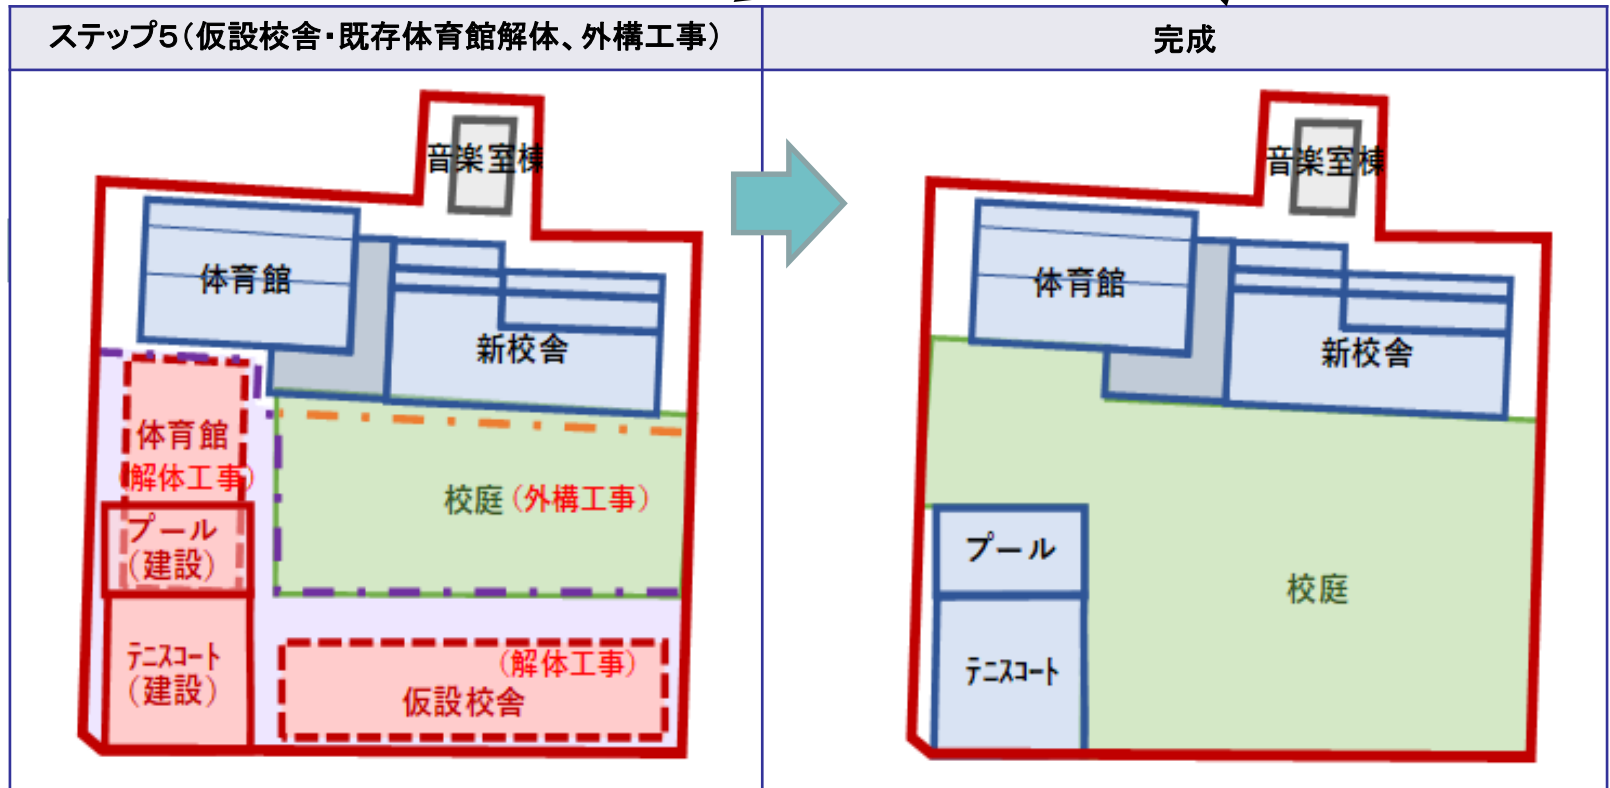



5 関係する生徒・児童について

関係する生徒・児童について

学校名	年度	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		令和 5	令和 6	令和 7	令和 8	令和 9	令和10	令和11	令和12
第一中学校		10月 7月	← 10月 1月 →		仮設共用 中学校用地を共同利用する期間			仮設校舎・旧体育館棟解体工事 プール・テニスコート建設工事 外構工事	
井之頭小学校		基本設計	実施設計		解体工事	本体工事			
生 年 月 日 / 学 年 ・ 年 齢	平成20(2008)年4月2日～ 平成21(2009)年4月1日生	中3	・中学校の工事で影響を受ける学年 ・仮設校舎での生活						
	平成21(2009)年4月2日～ 平成22(2010)年4月1日生	中2	中3	・3学期のみ新校舎					
	平成22(2010)年4月2日～ 平成23(2011)年4月1日生	中1	中2	中3			・一中新校舎で生活する学年 ・校庭を小学生と共有		
	平成23(2011)年4月2日～ 平成24(2012)年4月1日生	小6	中1	中2	中3				
	平成24(2012)年4月2日～ 平成25(2013)年4月1日生	小5	小6	中1	中2	中3			
	平成25(2013)年4月2日～ 平成26(2014)年4月1日生	小4	小5	小6	中1	中2	中3		
	平成26(2014)年4月2日～ 平成27(2015)年4月1日生	小3	小4	小5	小6	中1	中2	中3	
	平成27(2015)年4月2日～ 平成28(2016)年4月1日生	小2	小3	小4	小5	小6	中1	中2	中3
	平成28(2016)年4月2日～ 平成29(2017)年4月1日生	小1	小2	小3	小4	小5	小6	中1	中2
	平成29(2017)年4月2日～ 平成30(2018)年4月1日生	5歳	小1	小2	小3	小4	小5		中1
	平成30(2018)年4月2日～ 平成31(2019)年4月1日生	4歳	5歳	小1	小2	小3	小4		
	平成31(2019)年4月2日～ 令和2(2020)年4月1日生	3歳	4歳	5歳	小1	小2	小3		
	令和2(2020)年4月2日～ 令和3(2021)年4月1日生	2歳	3歳	4歳	5歳	小1	小2		
	令和3(2021)年4月2日～ 令和4(2022)年4月1日生	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	小1		
								中学校地内の仮設校舎 で生活する学年	



最後に

工事につきましては、
日々ご協力いただき、
誠にありがとうございます。

今後も、ご理解とご協力の程、
よろしくお願い申し上げます。

