

エコreゾート関連工事の進捗について

令和元年度に実施したエコreゾート関連工事の進捗状況及び令和2年度に実施予定の工事概要は以下のとおり。また、今年度も関連工事を予定している。

■令和元年度工事進捗一覧

工事名称	施工期間
内装工事	【完了】令和元年12月～令和2年3月
空調工事	【完了】令和元年9月～令和2年2月
電気工事	【完了】令和元年9月～令和2年2月
給排水工事	【完了】令和元年9月～令和2年3月
昇降機工事	【完了】令和元年9月～令和2年3月
蓄電池工事 (令和元年～2年の2ヶ年工事)	【令和元年度分完了】令和元年9月～令和2年2月
緑町ふれあい広場整備	【完了】令和元年10月～令和2年3月
西側歩道整備	※ 令和元年10月～令和2年4月末完了予定
クリーンセンター外構整備	【完了】令和元年10月～令和2年3月

※ 新型コロナウイルス感染症の影響により、材料調達に時間を要しているため、施工期間が延伸している。

■令和2年度工事予定一覧

工事名称	施工期間(予定)	施工内容
内装工事	令和2年6月～10月	造作家具・サイン等整備
蓄電池工事 (令和元年～2年の2か年工事)	【令和2年度分】 令和2年5月～令和3年2月	フェンス整備・試運転調整

* 内装工事は昨年度の入札不調・再入札により、着工が大幅に遅れ、年度内の竣工が不可能となったため、造作家具・サイン等整備(建物内工事)を今年度別途発注する。

* 蓄電池工事は、フェンス整備と試運転調整が主な施工内容となっている。

■参考（主な工事の完了後の現況写真）




芝生広場



エコプラザ(仮称) 2階アーカイブコーナー・事務室



エコプラザ(仮称) 1階プラットホーム

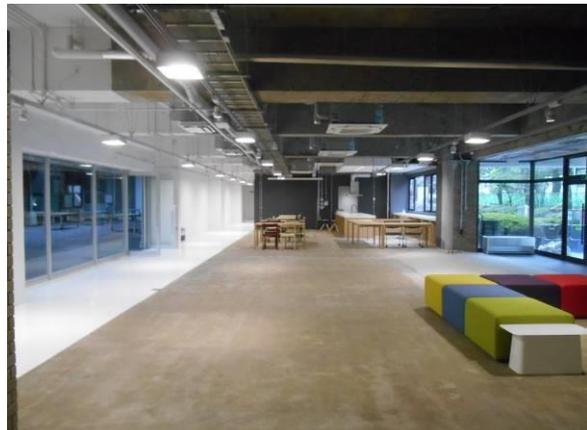

エコプラザ(仮称) 1階ホールとカフェスペース



エコプラザ(仮称) 蓄電池
