


改築のステップと影響

	ステップ1	ステップ2	ステップ3	ステップ4	ステップ5-1	ステップ5-2	ステップ5-3
第一中	第一中仮設校舎建設 (R4年2月頃～8月頃)	第一中旧校舎解体 (R4年9月頃～R5年6月頃)	第一中新校舎、新体育館建設 (R5年7月頃～R7年1月頃)	第一中新校舎、新体育館完成/井之頭小が第一中校地に仮移転 (R7年4月頃～R9年12月頃)	井之頭小新校舎、新体育館完成/第一中旧体育館、仮設校舎解体 (R10年1月頃～R10年4月頃)	第一中旧体育館解体、外構工事 (R10年1月頃～R11年3月頃)	第一中外構工事、プール建設、テニスコート整備 (R11年4月頃～R11年8月頃)
通学	正門、東門	仮設門（東側）、東門	仮設門（東側）	東門	同左	同左	正門、東門
体育 (校庭)	現在よりも校庭が狭くなりますが、授業は実施できます。	同左	同左	現在よりも校庭が狭くなりますが、授業は実施できます。小学校と共用となるため使用は運用で検討します。	現在よりも校庭が狭くなりますが、授業は実施できます。	同左	同左
体育 (体育館)	既存の体育館を使用できます。	同左	同左	新体育館を使用できます。（中学校専用）	新体育館を使用できます。	同左	同左
プール	既存のプールを使用できます。	同左	同左	既存のプールを使用できます。小学校と共用となるため使用は運用で検討します。	既存のプールは工事のため使用できません。代替地を検討します。	同左	新プールは工事のため使用できません。代替地を検討します。
体育祭	現在よりも校庭が狭くなるため、代替地を確保し、体育祭を開催します。	同左	同左	同左	同左	同左	同左
休み時間	中学校利用	同左	同左	校庭は小学校と共用となるため使用は運用で検討します。	中学校利用	同左	同左
音楽室棟 (音楽ホール)	影響なし	音楽棟の使用は一旦校外に出てから北門より	同左	影響なし	同左	同左	同左
部活動 (校庭)	現在よりも校庭が狭くなるため、校庭を使用する部活動については制限が生じます。部活動の練習形態によっては、代替地を検討します。	同左	同左	現在よりも校庭が狭くなるため、校庭を使用する部活動については制限が生じます。部活動の練習形態によっては、代替地を検討します。放課後、校庭は小学校と共用となるため使用は運用で検討します。	現在よりも校庭が狭くなるため、校庭を使用する部活動については制限が生じます。部活動の練習形態によっては、代替地を検討します。	同左	同左
部活動 (体育館)	既存の体育館を使用できます。	同左	同左	新体育館を使用できます。（中学校専用）	新体育館を使用できます。	同左	同左
部活動 (テニスコート)	既存のテニスコートを使用できます。	同左	同左	同左	既存のテニスコートは工事のため使用できません。代替地を検討します。	同左	新テニスコートは工事のため使用できません。代替地を検討します。

	ステップ1	ステップ2	ステップ3	ステップ4	ステップ5-1	ステップ5-2	ステップ5-3
井之頭小	第一中仮設校舎建設 (R4年2月頃～8月頃)	第一中旧校舎解体 (R4年9月頃～R5年6月頃)	第一中新校舎、新体育館建設 (R5年7月頃～R7年1月頃)	第一中新校舎、新体育館完成/井之頭小が第一中校地に仮移転 (R7年4月頃～R9年12月頃)	井之頭小新校舎、新体育館完成/第一中旧体育館、仮設校舎解体 (R10年1月頃～R10年4月頃)	第一中旧体育館解体、外構工事 (R10年1月頃～R11年3月頃)	第一中外構工事、プール建設、テニスコート整備 (R11年4月頃～R11年8月頃)
通学	現在の施設を使用できます。	同左	同左	第一中校地への通学となるため、見守り箇所増設、見守り人員増員、スクールバス運行等の安全対策を実施します。門は仮設門（東側）を使用します。	新施設を使用できます。	新施設を使用できます。	同左
体育（校庭）				第一中の校庭を使用します。現在よりも校庭が狭くなりますが、授業は実施できます。中学校と共用となるため使用は運用で検討します。	井之頭小校庭工事のため、使用できない期間がありますが、確実に授業を実施するための対策を検討します。		
体育（体育館）				第一中の既存の体育館を使用できます。（小学校専用）	新施設を使用できます。		
プール				第一中の既存のプールを使用できます。中学校と共用となるため使用は運用で検討します。水深等は小学校仕様とします。			
運動会				現在よりも校庭が狭くなるため、代替地を確保し、運動会を開催します。			
休み時間				校庭は中学校と共用となるため使用は運用で検討します。	新施設を使用できます。		
地域子ども館 (学童・あそべえ)				地域子ども館は、第一中の既存の体育館棟にある視聴覚室、ホールを使用します。放課後、校庭は中学校と共用となるため使用は運用で検討します。			


ステップ1 令和4年2月頃～8月頃

（仮設校舎 建設）

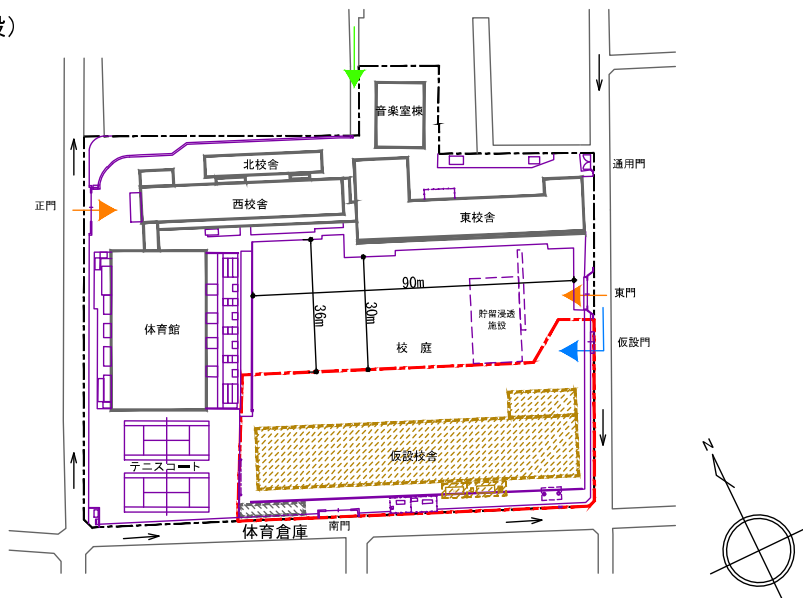


ステップ2 令和4年9月頃～令和5年6月頃

（旧（東西北）校舎 解体）

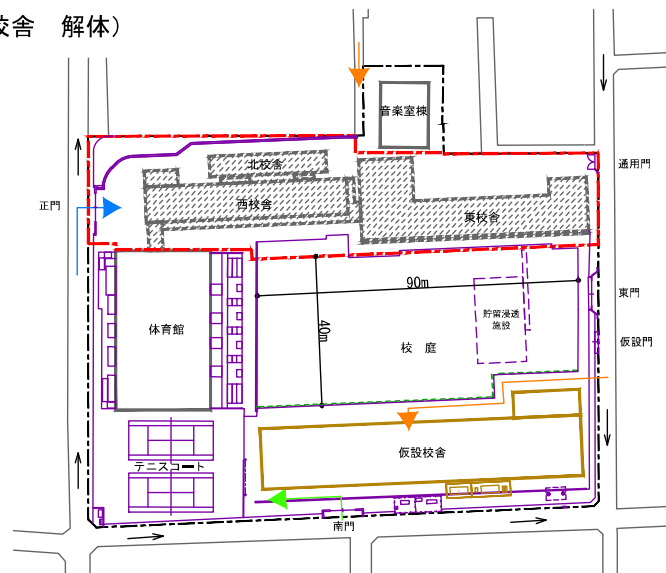


ステップ3 令和5年7月頃～令和7年1月頃

（新校舎・新体育館 建設）

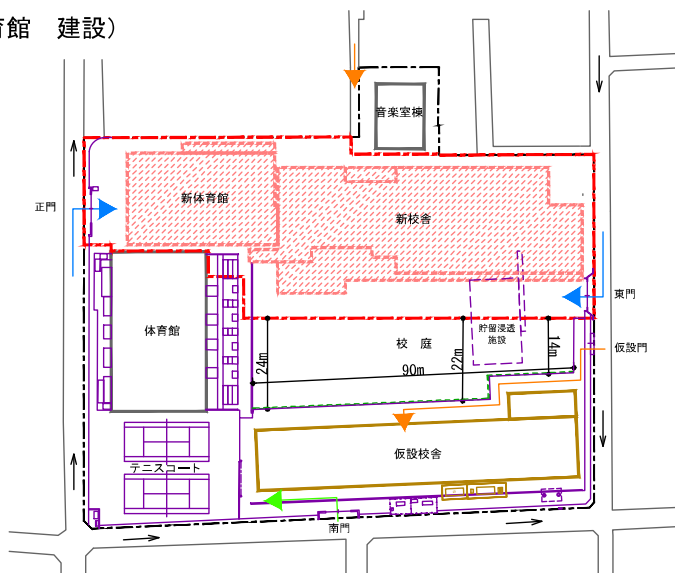

ステップ4 令和7年4月頃～令和9年12月頃

（新校舎完成（小学校・中学校共同利用））

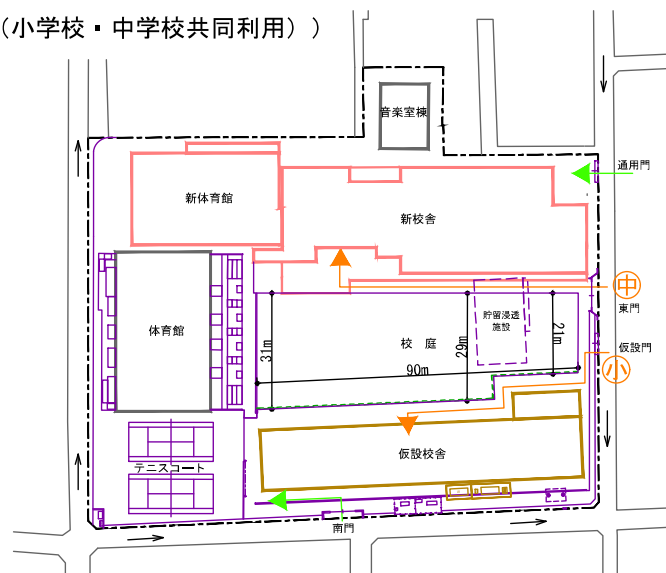


凡例		既設		建物等の点線表示は工事中を示す。		動線（学校）
		仮設		既存外構物を示す。		動線（工事車両）
		仮囲		仮設側溝を示す。		動線（給食車両）
		新設				

ステップ5-1

令和10年1月頃～令和10年4月頃


(旧体育館・仮設校舎 解体)

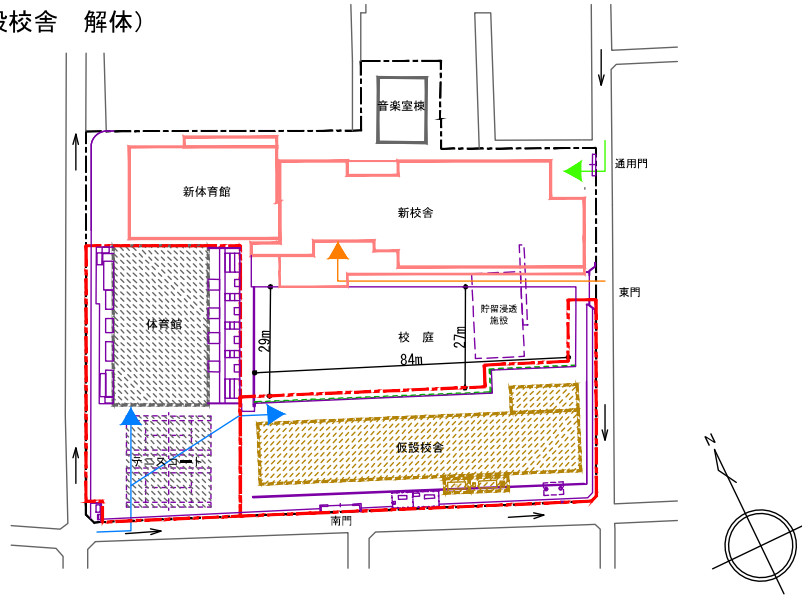

ステップ5-2

令和10年1月頃～令和11年3月頃


(旧体育館解体・外構工事 (体育館倉庫含む))

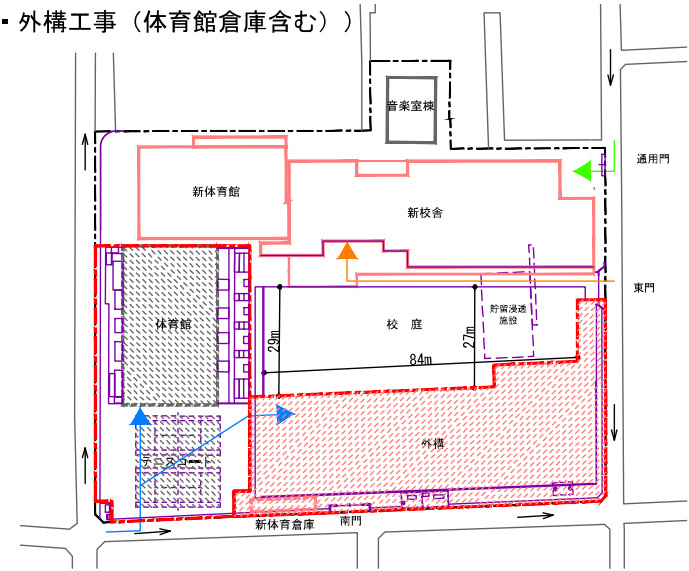

ステップ5-3


令和11年4月頃～令和11年8月頃

(外構工事 (プール・テニスコート整備含む))

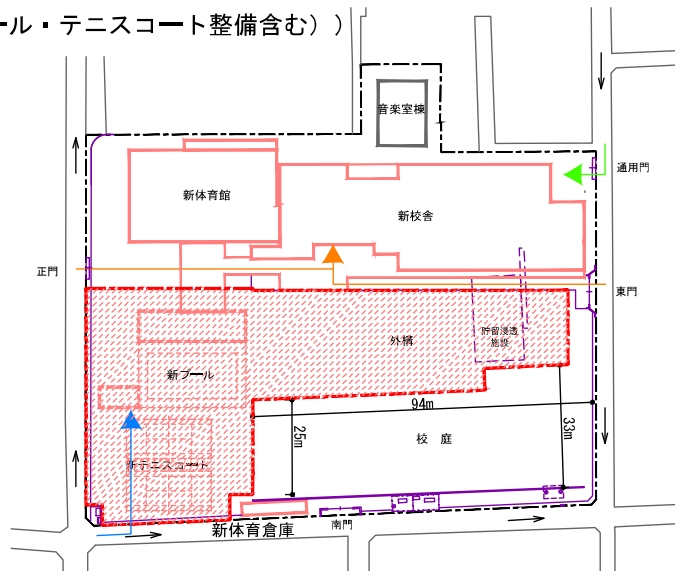

完成

令和11年9月頃

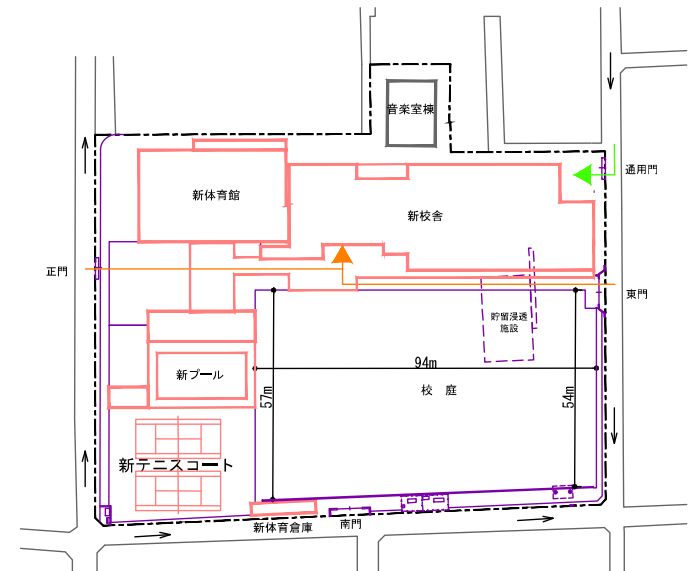

凡例		既設		建物等の点線表示は工事中を示す。		動線 (学校)
		仮設		既存外構物を示す。		動線 (工事車両)
		新設		仮設側溝を示す。		動線 (給食車両)
		仮囲				
