

武蔵野総合体育館大規模改修
保全整備基本計画

令和6年3月

目次

I. 基本計画策定に至る背景と位置づけ

- I-1 計画策定の背景・目的 …… 1
- I-2 基本計画策定における、他計画との関係 …… 2
- I-3 基本計画の位置づけ …… 3

II. 武蔵野総合体育館の概要、現状と課題

- II-1 武蔵野総合体育館の周辺環境 …… 4
- II-2 建設経緯 …… 5
- II-3 施設概要 …… 6
- II-4 施設の現状 …… 8
- II-5 課題 …… 11
- II-6 主な保全整備履歴 …… 17

III. 大規模改修の基本的な考え方

- III-1 計画対象範囲 …… 18
- III-2 基本方針 …… 19

IV. 改修内容について

- IV-1 『劣化保全整備』の改修内容 …… 20
- IV-2 『改良保全整備』の改修内容 …… 23
- IV-3 『機能維持・向上工事』の改修内容 …… 27
- IV-4 各諸室の改修内容 …… 31

V. 今後のスケジュール

- V-1 設計及び工事スケジュール …… 36
- V-2 全館休館期間 …… 36
- V-3 概算工事費 …… 36

VI. 計画上の留意点について

- VI-1 計画上の留意点 …… 37

VII. 意見聴取（パブリックコメント）の実施と市の対応方針

- VII-1 意見聴取（パブリックコメント）の実施と市の対応方針 …… 38
- VII-2 意見内容と市の対応方針 …… 38

I. 基本計画策定に至る背景と位置づけ

I-1 計画策定の背景・目的

武蔵野総合体育館は、全市的な市民施設として平成元（1989）年に竣工し、市民スポーツの拠点として長年多くの方々に利用されてきた。また、地域に根付いた健康維持・増進のための施設でもあり、公の施設として高齢者や障害のある方のスポーツ活動を支えるセーフティネットの役割も担っており、地域のスポーツ活動や交流の場として長年親しまれている。

さらに、武蔵野総合体育館をはじめとする市立スポーツ施設は、近年の国際的な親善試合や国際交流の創出、Sports for All におけるトップアスリートと市民との触れ合いなど、スポーツを通して様々交流の機会を市民にもたらし、スポーツが持つ本来の価値を市民へ還元する役割を担っている。

一方で、武蔵野総合体育館は、竣工後も着実に改修を重ね、適宜機能向上を図ってきたが、築 30 年以上が経過しており、経年による老朽化が進んだ給排水管、空調、昇降機、電気設備などを更新するため、長期休館を要する保全工事が必要な時期を迎えている。市民スポーツの拠点でもあり市立スポーツ施設の要でもある総合体育館について、今後も多くの市民に利用され、多様なスポーツ文化を創出できるよう、大規模な保全改修工事を行うことは必要不可欠である。


また、この間の障害者スポーツをはじめとしたスポーツ種目の多様化への対応や、さらなる施設のバリアフリー化など、施設面における社会的要求の変化等に対応することは、スポーツが持つ心身の健康づくりや充足感の醸成、人と人との交流の促進、地域の一体感や活力の醸成など、市立スポーツ施設が持つ役割や可能性をより一層広げていくことにつながっていく。そのため、今回の保全工事に合わせてこれらの視点を含めた総合的な改修が求められている。

このようなことから、今後 30 年程度引き続き現在の施設を使用していくための劣化保全整備に加えて、改良保全整備や機能維持・向上工事を含めた大規模な保全改修を行うことにより、引き続き市民のスポーツ文化の発展に寄与していくことを目的として、本計画を定める。

I-2 基本計画策定における、他計画との関係

本計画は、市の最上位計画である武蔵野市第六期長期計画、第2期武蔵野市公共施設等総合管理計画、武蔵野市立体育施設類型別施設整備計画、武蔵野市公共施設保全改修計画に基づき、整備に向けた基本的な考え方を示すものとする。


なお、第二期武蔵野市スポーツ推進計画では、「市民の誰もがスポーツを楽しみ豊かな生活を送り続けられる 武蔵野市」を基本理念に掲げ、性別、年齢、障害の有無などを問わず、市民の誰もがスポーツの魅力や価値を実感し、自由に気軽にスポーツを楽しみ、豊かな生活を送ることができるようなまちを目指している。さらに、重点施策の一つに「スポーツ施設の整備」を掲げ、市民スポーツの拠点でもあり市立スポーツ施設の要でもある総合体育館について、今後も多くの市民に利用され、多様なスポーツ文化を創出できるよう、大規模な改修工事を行うとしている。

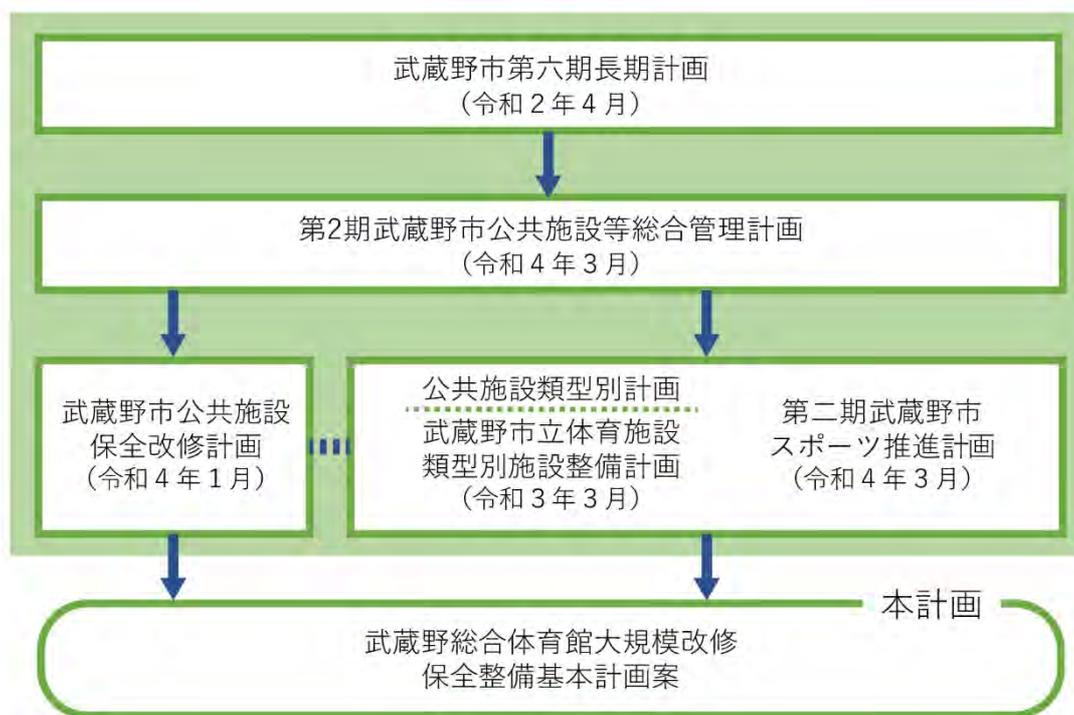

計画の位置づけ、上位計画等との関連

I-3 基本計画の位置づけ

本計画においては、保全改修工事における基本方針を示すとともに、基本設計・実施設計における設計と条件を整理するものとする。

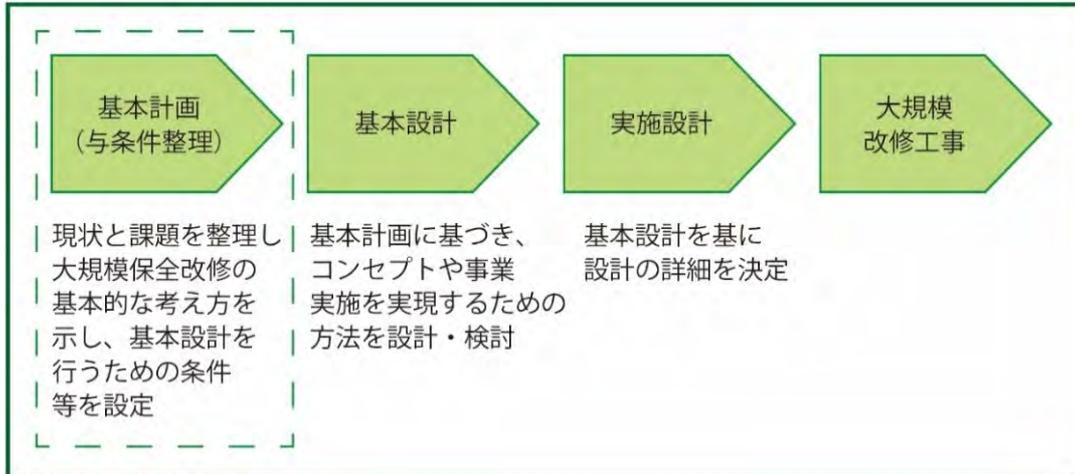

Ⅱ. 武蔵野総合体育館の概要、現状と課題

Ⅱ-1 武蔵野総合体育館の周辺環境

武蔵野総合体育館は、JR 三鷹駅からバスで 10 分程の場所に位置している。周辺には武蔵野市役所、武蔵野クリーンセンターがあり、駅から離れているにも関わらず人通りの多い環境に置かれている。

武蔵野総合体育館正面の中央通り（市道 17 号線）は、駅などの要所へのアクセスを担う生活に密接に関連した幹線道路としての役割を果たしている。また、桜の名所として親しまれており、武蔵野中央交差点から市営プール前交差点付近までトンネルのように桜並木が続く緑の軸となっていて、通行する人々の心に潤いと安らぎを与える空間となっている。



武蔵野市役所



体育館正面（中央通り側）

武蔵野総合体育館周辺には、陸上競技場や市営プール、ストリートスポーツ広場が隣接し、中央通りをはさんで軟式野球場や庭球場も整備されている。これらの体育施設の受付業務は、武蔵野総合体育館 1 階で行っており、市民スポーツの拠点としての役割を担っている。



武蔵野総合体育館の外観



武蔵野総合体育館周辺施設

Ⅱ-2 建設経緯

戦後、中島飛行機武蔵製作所の跡地を利用して、野球場やサッカー場、陸上競技場が整備された。その後平成元（1989）年11月、陸上競技場隣接地に武蔵野総合体育館が整備された。

完成までの主な経過は以下のとおり

昭和60（1985）年9月

○市民スポーツ振興計画検討委員会中間報告にて総合体育館基本構想が示される

昭和61（1986）年3月

○総合体育館の設計予算、3月市議会定例会で可決

昭和61（1986）年6月

○指名設計競技審査報告書が提出される（基本構想案を選定）

昭和61（1986）年8月

○武蔵野総合体育館建設関係者会議が発足

昭和61（1986）年12月

○建設計画地元説明会を開催（第1回、以降計7回）

昭和62（1987）年3月

○工事予算、3月市議会定例会で可決

昭和62（1987）年7月

○建築基準法に基づく東京都の公聴会が開催される

○工事請負契約議案が9月市議会定例会で可決され、工事が始まる

平成元（1989）年9月

○財団法人武蔵野スポーツ振興事業団（現公益財団法人武蔵野文化生涯学習事業団）が設立許可される

平成元（1989）年11月

○武蔵野総合体育館オープン

II-3 施設概要

①敷地概要


敷地面積	56,669.47 m ²
前面道路幅員	西側：市道 17 号線 15m、北側：市道 41 号線 9m
敷地位置	東京都武蔵野市吉祥寺北町5-11-20
区域	都市計画区域内 市街化区域
用途地域	第一種住居地域（指定建ぺい率 60%、指定容積率 200%）
防火地域	準防火地域
高度地区	第2種高度地区（23m）
日影規制	4-2.5h/4m

②建物概要

竣工年月	平成元（1989）年8月31日	
建築面積	14,824.01 m ²	※武蔵野陸上競技場・スタンド席を含む。
延床面積	22,966.76 m ²	※武蔵野陸上競技場・スタンド席を含む。
構造	SRC、RC、S 造	
用途	体育館	
階数	地上5階 地下1階 塔屋1階	
設備概要	電気設備	設備：高圧受変電設備 受電：クリーンセンターから電力受電
	空気調和設備	熱源機器：吸収式冷凍機、冷却塔、熱源ボイラ、 プール用蒸気ボイラ 空調機器：空調機エアハンドリングユニット、空冷式 ヒートポンプパッケージ、ガスヒートポンプ パッケージ、ファンコイルユニット 風道設備：全熱交換器 自動制御：自動制御機器、中央監視装置 熱源供給：クリーンセンターから蒸気受給
	給排水 衛生設備	給水：受水槽、高架水槽方式 排水：下水道放流
	その他	放送設備、監視設備、火災報知器設備、スプリンクラー設備、 屋内消火栓設備、屋外消火栓設備、非常用電源設備

③利用者数

市民スポーツの拠点として子どもから学生、高齢者、障害のある方まで幅広い世代の市民に親しまれており、利用者数はコロナ禍を除き大きな変動はない。継続的に多くの市民が利用している状況である。

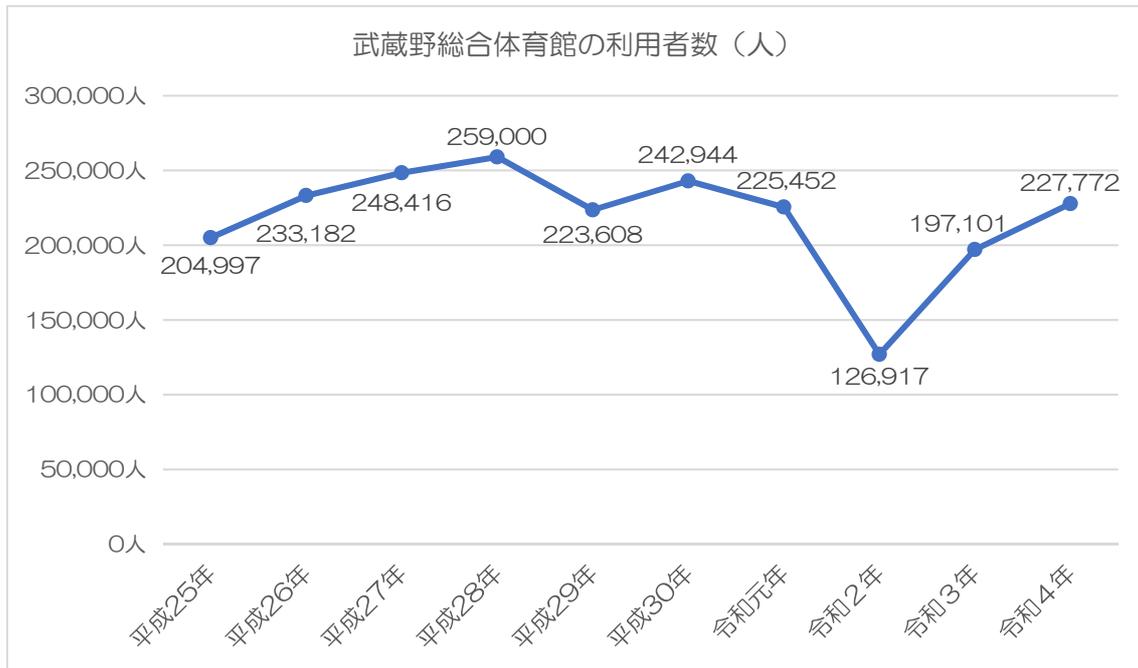

Ⅱ-4 施設の現状

体育館には下記の機能が整備されている。利用時間は午前9時から午後9時30分まで。開館当時想定していた種目以外でも多様な目的で施設が利用されている。

<p>メインアリーナ (1F)</p>	<p>○規模：競技フロアー1,730㎡、45m×37m（2分割、3分割の使用が可）ランニング走路 180m/周、選手控席 395 席、天井高 13.7m</p> <p>○開館当時に想定していた種目、用途： バレーボール3面、バスケットボール2面、 バドミントン 10 面、卓球、フットサル</p> <p>○上記以外で使用している種目、用途： 車いすバスケットボール、車いすバドミントン、ボッチャ、 バウンドテニス、ドッチビー、シットイングバレーボール、 インディアカ、スカットボール、ミニテニス、剣道、 相撲、太極拳、新体操、エアロビクス、ソシアルダンス、運動会、 選挙開票場、パブリックビューイング</p> <p>○設備：冷暖房設備、放送設備、得点表示装置、簡易ステージ</p>
<p>サブアリーナ (2F)</p>	<p>○規模：競技フロアー847㎡、23×33m（2分割使用可）、天井高9m</p> <p>○開館当時に想定していた種目、用途： バレーボール2面、バスケットボール1面、 バドミントン4面、卓球、フットサル</p> <p>○上記以外で使用している種目、用途： 車いすバスケットボール、車いすバドミントン、ボッチャ、 バウンドテニス、シットイングバレーボール、インディアカ、 スカットボール、ミニテニス、ドッチビー、剣道、太極拳、 新体操、エアロビクス、ソシアルダンス、運動会</p> <p>○設備：冷暖房設備、放送設備、簡易ステージ</p>
<p>軽体操ダンス室 (1F)</p>	<p>○規模：競技フロアー369㎡、15×23m（3分割の使用が可）</p> <p>○開館当時に想定していた種目、用途：各種ダンス、 体操・マット運動</p> <p>○上記以外で使用している種目、用途： ソシアルダンス、フォークダンス、フラメンコ、エアロビクス、 バレエ、新体操、選挙事務、選手・ボランティア・審判等控室</p> <p>○設備：冷暖房設備、放送設備、鏡張り壁面、移動式鏡(5台)</p>
<p>卓球室（1F）</p>	<p>○規模：競技フロアー320㎡</p> <p>○開館当時に想定していた種目、用途：卓球</p> <p>○上記以外で使用している種目、用途：選手控室（国体時）</p> <p>○設備：卓球台8台、ラケット、ボールの貸出あり</p>

トレーニング室 /体力測定室 (1F)	<p>○規模：トレーニング室 420 m²、体力測定室 94 m²</p> <p>○開館当時に想定していた種目、用途： トレーニング機器によるトレーニング、体力測定</p> <p>○上記以外で使用している種目、用途： エアロビクスなどのオリジナルプログラム</p> <p>○設備：有酸素系マシン各種（ランニングマシン、エアロバイクなど）、筋力トレーニングマシン各種、マッサージチェア、その他器具（ストレッチマット、バランスボール、ストレッチポールなど）</p>
幼児室（1F）	<p>○規模：128 m²</p> <p>○開館当時に想定していた種目、用途：幼児室</p> <p>○上記以外で使用している種目、用途：読み聞かせ</p> <p>○設備：すべり台、ブロック、小トランポリン</p>
コミュニティラ ウンジ (2F)	<p>○規模：127 m²</p> <p>○開館当時に想定していた種目、用途：食堂</p> <p>○上記以外で使用している種目、用途：自動販売機による軽食販売、飲食が可能な休憩スペース、親子スペース</p> <p>○設備：テーブル、椅子</p>
大会議室（3F）	<p>○規模：133 m²、90 席分（2分割使用可）</p> <p>○開館当時に想定していた種目、用途：会議、研修会、講習会</p> <p>○上記以外で使用している種目、用途： 選手・ゲスト・審判控室、軽運動</p> <p>○設備：プロジェクター、スクリーンの貸出しあり</p>
視聴覚室（3F）	<p>○規模：101 m²、63 席</p> <p>○開館当時に想定していた種目、用途：会議、研修会、講習会</p> <p>○上記以外で使用している種目、用途： 選手・ゲスト・審判控室、プレスルーム</p> <p>○設備：プロジェクター、スクリーンの貸出しあり、放送設備</p>
和室研修室 (3F)	<p>○規模：101 m²、33 畳、（2分割使用可）</p> <p>○開館当時に想定していた種目、用途：会議、研修会、講習会</p> <p>○上記以外で使用している種目、用途： 託児・選手・ゲスト・審判控室</p> <p>○設備：なし</p>
洋室研修室 (3F)	<p>○規模：37 m²、18 席</p> <p>○開館当時に想定していた種目、用途：会議、研修会、講習会</p> <p>○上記以外で使用している種目、用途：選手・ゲスト・審判控室</p> <p>○設備：なし</p>

柔道場（4F）	<p>○規模：228 m²（128畳） 15×15m</p> <p>○開館当時に想定していた種目、用途： 柔道、剣道、空手、太極拳、気功、合気道、ヨガなど</p> <p>○上記以外で使用している種目、用途：なし</p> <p>○設備：柔道畳 128 畳、放送設備</p>
剣道場（4F）	<p>○規模：228 m²、15×15m</p> <p>○開館当時に想定していた種目、用途： 剣道、柔道、空手、太極拳、気功、ヨガなど</p> <p>○上記以外で使用している種目、用途：ボッチャ</p> <p>○設備：放送設備</p>
弓道場（4F）	<p>○規模：的場 102 m²（5人立）</p> <p>○開館当時に想定していた種目、用途：弓道、アーチェリー</p> <p>○上記以外で使用している種目、用途：なし</p> <p>○設備：車椅子スロープ設置あり</p>



Ⅱ-5 課題

オープンから30年以上が経過し施設の老朽化が進行しており、利用者の安全性、利便性についても様々な課題点を抱えている。ヒアリングや現地調査、武蔵野市立体育施設類型別施設整備計画（令和4（2022）年3月）で挙げられた主な課題点を下記にまとめる。


- 地下室等にある耐用年数を越えた設備機器の更新工事も十分には行えておらず、故障のリスクが高まっている。
- 競技用のフローリングが建設当初から更新されておらず、床の割れ及び床下地の劣化が発生している。
- エレベーターは竣工当時のままであり、耐震性能が現行基準に比べ劣っている。また、ストレッチャーが利用できない大きさであるため、緊急搬送の際にエレベーターが使用できない。
- 更衣室の洗面スペースは、手洗い器のみのため、ドライヤーの使用や化粧などがし難い。
- 玄関ホールが暗い。また、受付が奥まっているため正面出入口から受付を判別し難い。
- 館内案内表示が統一されておらずサインが不足している。また識別し難いサインが多い。
- デジタルサイネージが不足しており、利用状況や混雑状況がリアルタイムで発信できていない。
- 主要な通路にも関わらず、車いす利用者に不便な開き戸となっている箇所がある。
- 点字ブロック・階段手摺の設置がない等、バリアフリー化ができていない箇所がある。
- 幼児室が設置されているが、専用の授乳室がない。また、おむつ交換スペースが少ない。
- 多くの部屋で蛍光灯や水銀灯が使用されており、LED化（省エネルギー化）が必要な箇所がある。
- 自動水栓等が付いている節水型衛生設備の設置が不十分である。
- 倉庫・文書庫が不足し、廊下等に備品が置かれている。
- 防火シャッターの危害防止装置が一部整備されていない。
- 高窓用の開閉装置が劣化し、窓が開閉し難い。

前述の課題やその他の現状写真を下記に示す。

○竣工当時から使用しており耐用年数が過ぎている空調設備機器やダクト（地下1階）

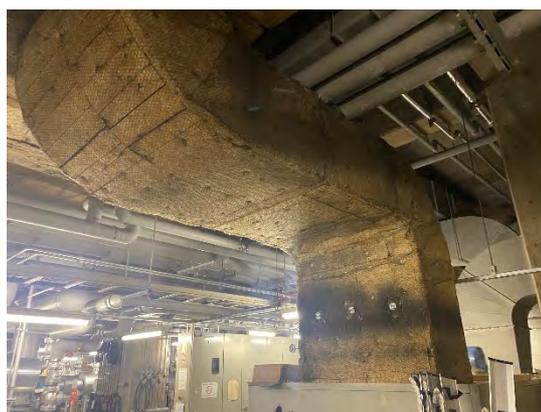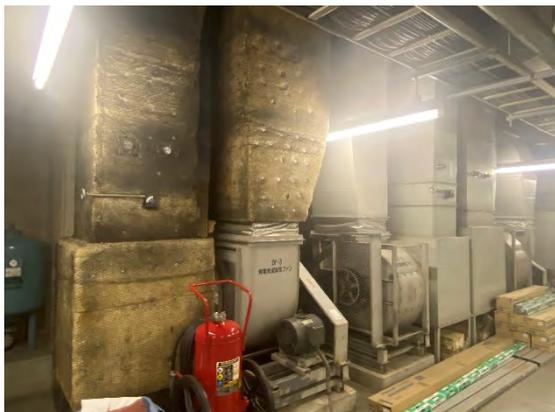

○劣化している機械設備機器や配管、ダクト（地下1階）

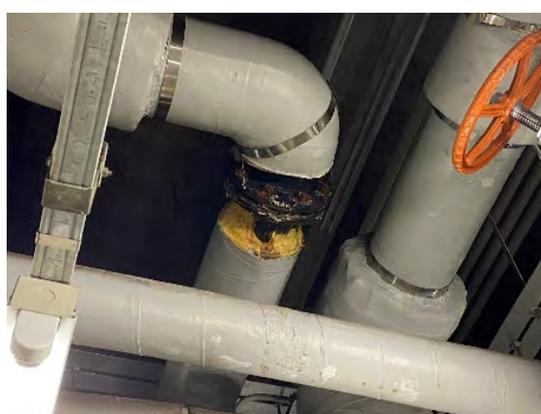

○ダクトや配管が密集しており、改修に時間を要すると想定される機械室（地下1階）



○武蔵野市立第四中学校の機械設備が更新設備機器の手前に設置されており、改修に時間を要すると想定される機械室（地下1階）



○薄暗く感じる玄関ホールと奥まった受付（1階）



○サインがなくエレベーターの位置がわかりにくい玄関ホール（1階）



○蛍光灯を使用している卓球場とトレーニング室の更衣室（1階）



○劣化している更衣室の洗面化粧台（1階）



○劣化しているメインアリーナの競技用フローリング（割れの発生）（1階）



○金物の剥離が見られる競技用フローリングの床下地（1階）



○劣化により色落ちし識別し難いサイン（2階）




○劣化しているメインアリーナ席（2階）



○車椅子利用者に不便な開き扉（２階）




○廊下に仮置きされている備品（２階）

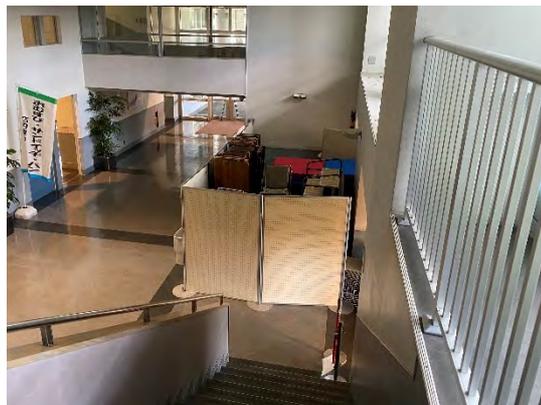

○劣化している廊下や弓道場の競技用フローリング（４階）



○劣化し使用できないパネルがある移動間仕切り壁（１階）

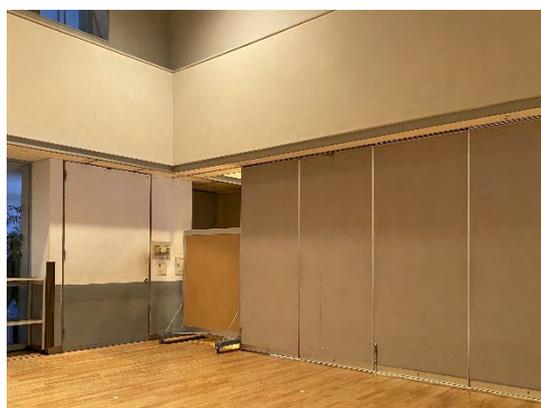

○劣化が見られる幼児室のシート（１階）




○ストレッチャーが利用できない大きさのエレベーター（エレベーター部分）



○手摺が片側のみの階段（各階）



○窓の開閉装置が劣化し開閉し難い高窓（各階一部）

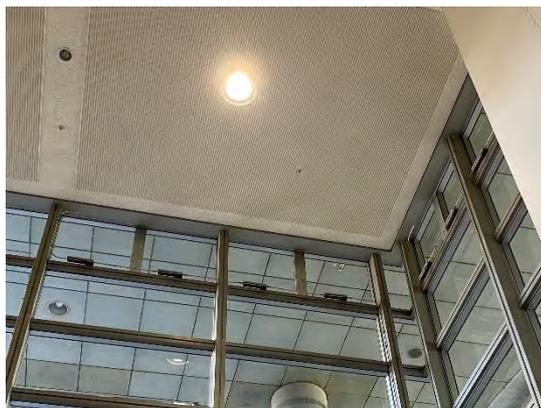

○漏水等による天井のシミ（各階一部）



○和式仕様のトイレ（各階一部）



Ⅱ-6 主な保全整備履歴

	工事名	整備内容
平成 23 (2011) 年度	武蔵野総合体育館東京国体競技施設整備に伴う空調設備設置工事	メインアリーナの空調設備を置換空調に改修
平成 28 (2016) ~29 (2017) 年度	武蔵野総合体育館アリーナ特定天井等改修工事	メインアリーナ、サブアリーナの天井の耐震化。LED 照明への交換
平成 28 (2016) ~29 (2017) 年度	武蔵野総合体育館メインアリーナ屋上防水改修工事	メインアリーナ屋根の防水改修
令和元 (2019) 年度	武蔵野総合体育館ボイラー系統還水槽更新工事	地下 1 階機械室に設置している還水槽 4 台更新
令和元 (2019) 年度	武蔵野総合体育館 3 階系統空調機更新工事	3 階系統空調室内機 12 台、室外機 9 台更新
令和元 (2019) 年度	武蔵野総合体育館吸収式冷凍機更新工事	地下 1 階機械室に設置している吸収式冷凍機更新
令和 3 (2021) ~4 (2022) 年度	武蔵野総合体育館外壁等改修工事	外壁、屋上防水、外部鉄部などの改修

劣化状況に応じて改修工事を適宜行っているが、部分的な実施のため、一部の配管や機器は更新されていないなど、新旧機器が混在している状況である。

長期休館を行い全面的な保全整備改修を行うことが望まれる。

Ⅲ. 大規模改修の基本的な考え方

Ⅲ-1 計画対象範囲


今回の改修工事の対象範囲は、武蔵野総合体育館とする。



計画対象範囲図

Ⅲ-2 基本方針

1	<p>『 劣化保全整備 』</p> <p>耐用年数を超過した機器が多く、空調機が故障している部屋もある。今回の改修で、建築当初の性能・機能を維持できるよう基本的な性能まで戻す整備を行う。また、競技用フローリングの改修や重要設備機器の更新など、一定期間の休館を要する工事は最優先で行い、リニューアル後は継続的な市民サービスを提供できる計画とする。</p>
2	<p>『 改良保全整備 』</p> <p>開館当時には無かった社会的要求の変化等に対応するための施設の機能向上を行うことが求められている。誰もが利用しやすい施設とするためのバリアフリー化は必須の課題となっており、また、武蔵野市環境配慮指針にあるように建設時の環境配慮も重要であり、これらの課題に積極的に取り組む改修計画とする。</p>
3	<p>『 機能維持・向上工事 』</p> <p>大規模改修であることから、リニューアル後にはより使いやすい施設にしていく視点も重要である。明るくわかりやすい玄関ホールや新たなサインの設置、中央通り沿いの外構整備など関連する工事のパッケージ化をすることで効率化を図る。</p>

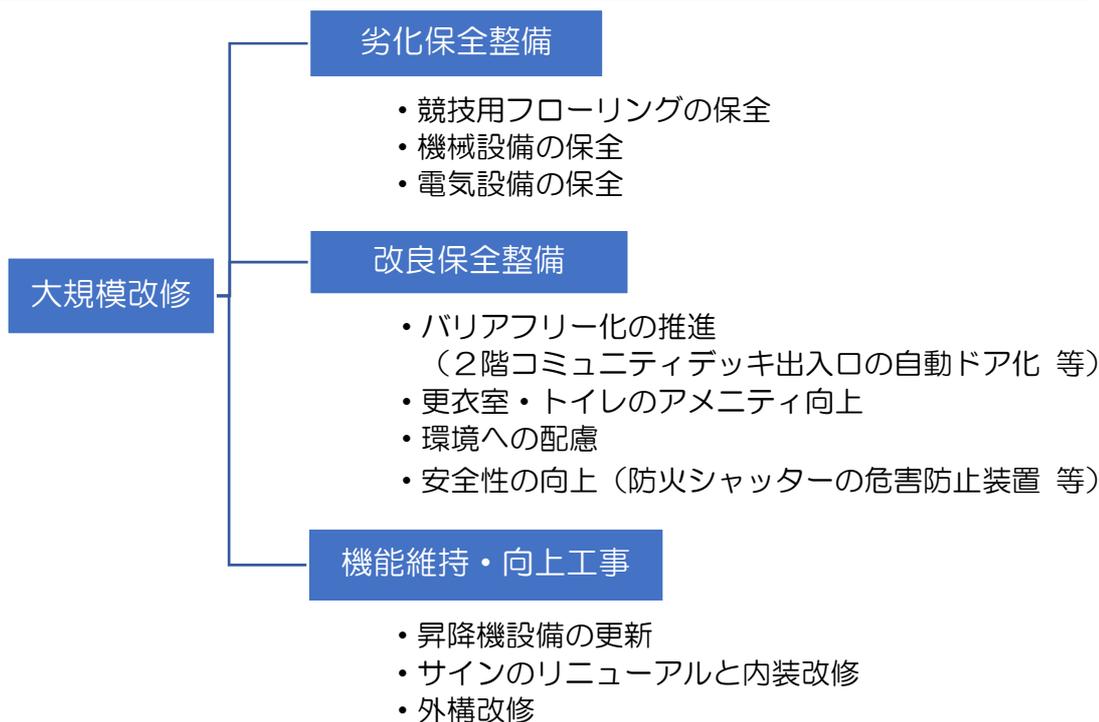

IV. 改修内容について

IV-1 『劣化保全整備』の改修内容


①競技用フローリングの保全

メインアリーナ、サブアリーナをはじめ、ダンス室、卓球場、柔剣道場の競技用フローリングには、へこみ、キズ、割れが非常に多く見られる。バレーボールやフットサル等で床にすべり込んだ際のささくれ事故を未然に防ぐためにも更新が必要である。

両アリーナとも床サンディング(床研磨+塗装)は実施したが、床の割れは依然発生しており、更新時期を迎えている。床材は競技者が直接接触するため、競技に大きく影響するものであることから、一部劣化が見られる床下地材も含めた更新を行う。



改修後の競技用フローリングイメージ

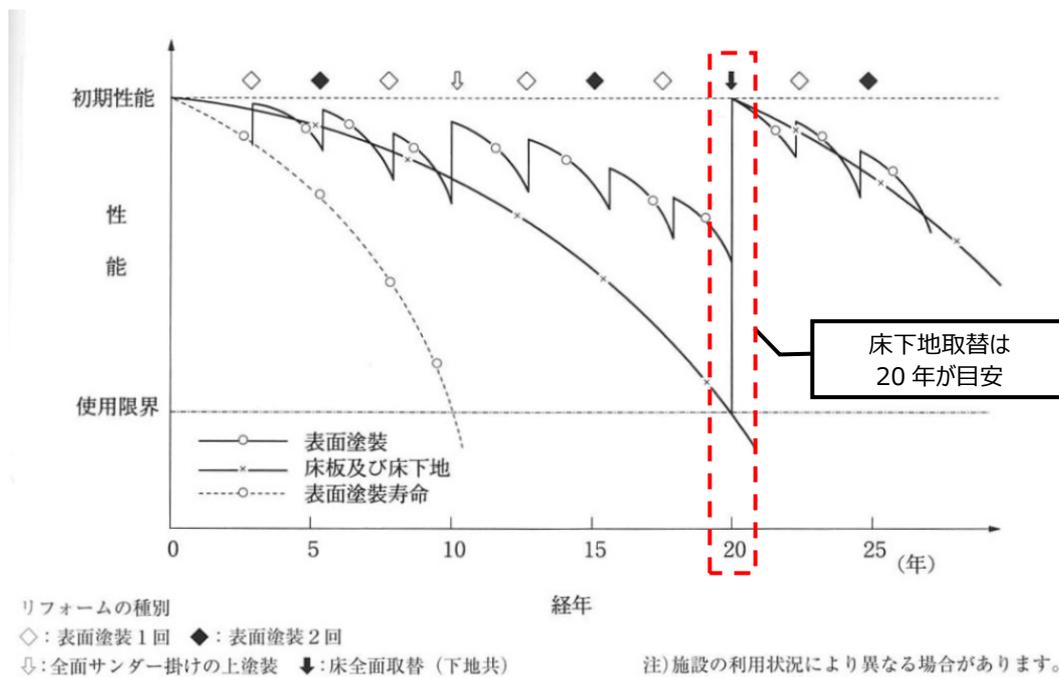

床の耐用年数と更新時期の関係図

出典：INDOOR SPORTS FLOOR p.49

著者：公益財団法人 日本体育施設協会 屋内施設フロア部会

②機械設備の保全

各種設備機器の多くは開館当時より使用されており、故障等の懸念があることから、耐用年数を超えた機器は更新が必要である。

特に更新に長期休館を伴う機器類は、今回の改修において必ず更新する必要がある。

○空調換気設備

- ・熱源機器の更新は長期休館を要するため、全面更新する。
- ・空調設備は、耐用年数を超えた機器や更新に長期休館を伴う機器の更新を行う。
- ・空調配管は更新時期を迎えており、水漏れによるリスクを考慮し、全面的な更新とする。
- ・ダクト類は、劣化は軽微であることから原則清掃のみとし、継続利用する。
- ・機器更新に伴い、自動制御設備の更新を行う。

○給排水衛生設備

- ・給水・給湯・排水・通気配管は、耐用年数を超えており劣化が懸念されることから、全面的に更新を行う。
- ・ポンプ類は、竣工当時より使用している機器の更新を行う。
- ・洗面器や便器などは、配管工事に伴い更新が必要となるが、武蔵野市環境配慮指針に基づき節水型便器・水栓を採用する。

○ガス設備

- ・上記空調設備更新に伴い、ガス配管を更新する。



腐食や老朽化が進む空調設備の状況

③電気設備の保全

機械設備同様に、各種設備機器の多くは開館当時より使用されており、故障時に部品調達の困難な機器が多数ある。電気設備は、建物の機能維持に関わる重要設備であることから、全面的に更新し、システムの信頼性を確保する必要がある。

○受変電設備 非常用発電設備

電気設備の要である受変電設備や非常用発電設備などは、建物の機能維持に関わる重要設備であることから、全面的に更新を行う。

○防災設備


非常照明、誘導灯、非常放送及び自動火災報知設備などの防災設備は、人命に関わる重要設備であることから、全面的に更新を行う。

○照明設備

まだ多くの部屋で蛍光灯や水銀灯が使われている。玄関ホールも蛍光灯による間接照明があり暗い印象がある。武蔵野市環境配慮指針に基づき、全面的に LED 照明機器への更新を行うとともに、照度を見直し明るい室内空間に改修する。

○競技施設特有の表示設備

サブアリーナの得点表示や柔剣道場の競技表示、弓道場の的中表示盤などは竣工当時のものが多く、使用されていない設備もある。これら表示設備については、使用状況を確認し必要に応じ最新の機器への更新を行う。

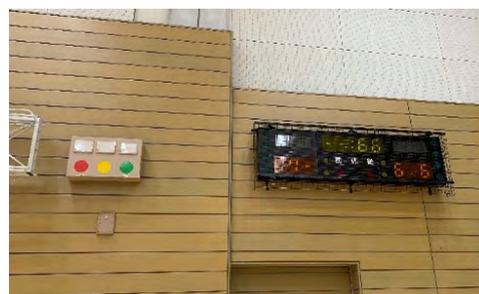

サブアリーナの得点表示板



老朽化が進む電気設備の状況

IV-2 『改良保全整備』の改修内容

①バリアフリー化の推進

開館当時から誘導床材や車椅子対応トイレを設けるなど、障害者にも配慮した建物ではあったが、この間の障害者スポーツの普及などを考慮した改修を設計段階で検討していく。

東京都福祉のまちづくり条例への適合化に加え、誰もが利用しやすい施設とするため、ユニバーサルデザインを取り入れ、さらなるバリアフリー化を推進する。

○2階コミュニティデッキ出入口の自動ドア化

エレベーターは南側にありメインアリーナ側の上下階移動の際、車椅子利用者は2階コミュニティデッキを通して移動することから、2階コミュニティデッキ出入口は自動ドアに改修し利便性を高める。

○ユニバーサルデザインの取り組み

年齢や性別、一人ひとりの個性に関わらず誰もが利用しやすいよう、障害者スポーツを推進していくうえで、バリアフリー化に留まらず多様なユニバーサルデザインの取り入れを検討する。下記に例を示す。

- ・ 親子観覧席や車椅子観覧席の増設
- ・ 床面と壁のコントラスト（弱視者対応）
- ・ 利用頻度の高い扉を引き戸に改修



床の塗装による誘導サイン、色のコントラストを用いたサイン（階段の出入口）の事例

②更衣室・トイレのアメニティ向上

更衣室やトイレは各競技室に付随するように設置されているが、一方で各更衣室の広さが十分に確保できていない状況である。一人当たりに必要な空間を広く確保することが求められ、ニーズに合わせた間仕切り壁の位置変更が必要である。また、単なる更衣の場ではなくリフレッシュできる場として、明るく健康的なアメニティ空間への改修が求められている。

○1階の更衣室・トイレの集約化


1階は南北2か所の更衣室及びトイレを1か所に集約配置し、使いやすい間仕切り壁の位置変更をし、利用者1人当たりの空間を広げる。また、新たに優先更衣室や多目的トイレを拡充する。

○明るく快適な更衣室・トイレへの改修

1階から4階までの更衣室及びトイレの内装改修を行い、アメニティ向上を図る。また、子ども専用トイレや授乳室を設置する。



明るいトイレの参考事例

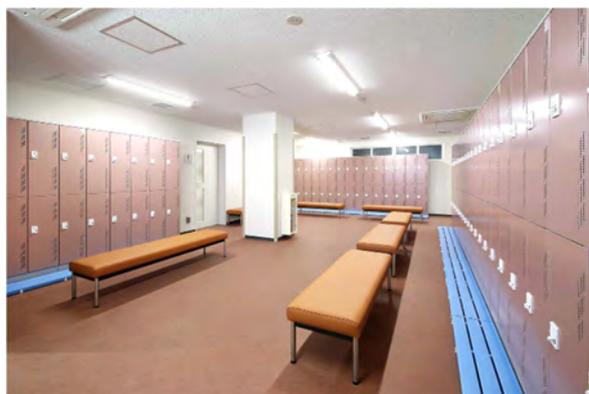

明るい更衣室の参考事例（神奈川県立体育センター）

③環境への配慮

地球を取り巻く環境は開館当時から大きく変化しており、武蔵野市公共施設の環境配慮指針を踏まえ、環境配慮技術を積極的に採用し、環境負荷低減に寄与する改修が求められている。

○再生可能エネルギーの利用

クリーンセンターからのバイオマスエネルギー供給（蒸気、電気）を活用した設備方針を継続する。

○空調設備の省エネルギー化

耐用年数を過ぎている空調機器は高効率機器を採用する。また更新に伴い、自動制御設備においても新しい省エネ制御技術であるCO₂制御、インバーター制御^{※1}を導入することにより、現状より環境性能の向上を図る。


○照明設備の省エネルギー化

照明器具更新では、LED照明を採用するとともに、トイレ等は人感センサーを採用し、省エネルギー化を図る。

※1：ポンプ、ファンなど、モーターの回転数を需要に応じて変動させることにより消費電力の削減を図る制御



クリーンセンター

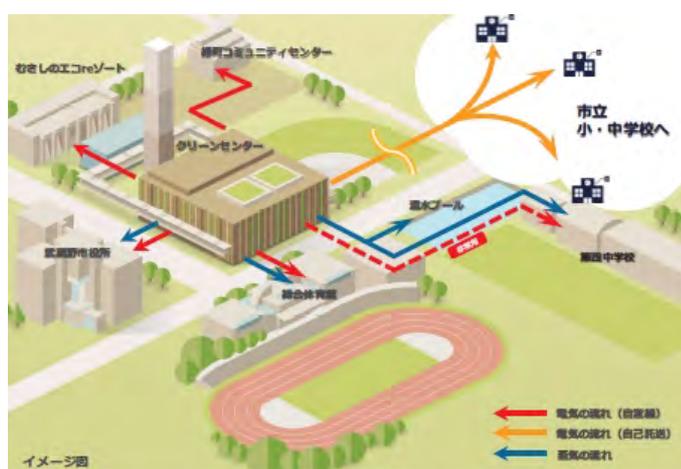

エネルギー供給の模式図

④安全性の向上

開館当時から現在に至るまでにより高い安全性能が建物に求められるようになったことも踏まえ、市民が安心して利用できるよう建築や設備の安全性能を向上させる。

○防火シャッターの危害防止装置の設置

防火シャッターの危害防止装置は、防火シャッターにより挟まれる事故を防ぐため法令により平成 17（2005）年から設置が義務付けられている。当施設でも適宜設置しているが、未設置の箇所もあるため、今回の大規模改修で危害防止装置を設置する。

○自動ドアの挟み込み防止柵の設置

自動ドアが開く際に戸袋付近にいたり、動くドアの衝撃や袖壁側に挟まれ、身体が引き込まれる事故につながるおそれがある。子どもも利用する施設であることから、今回の大規模改修では自動ドアに防護柵を設置する。



自動ドア用防護柵事例

○階段手摺・注意喚起床材の設置

利用者には高齢者も多く、階段でのつまづき防止策が求められる。現状の階段は片方しか手摺がなく、段差の注意喚起表示も設置されていない。高齢者がストレスなく利用できるよう、手摺増設や誘導床材の設置を行い、安全性を向上させる。



高齢者に優しい階段の事例

IV-3 『機能維持・向上工事』の改修内容

①昇降機設備の更新

既存のエレベーターは、月次メンテナンス等で安全性を確保しながら維持管理している状況である。

また、現在の寸法（間口 1.6m×奥行 1.5m）では、救急隊のストレッチャーが入らないため、4階柔剣道場からの緊急搬送が困難であり、利用者の安全の確保に課題がある。

○現行法規への適合

大地震時の昇降機の被害事例や事故を受けて、昇降機の安全性を強化した法改正がなされている。今回の休館期間にエレベーターを全面更新し安全性を高める。

○ストレッチャー対応のエレベーターへの改修

昇降路は変更せず、ストレッチャーが入ることのできる寸法（間口 1.05m、奥行き 2.0m）に交換する。



ストレッチャーに対応したエレベーターの参考事例

②サインのリニューアルと内装改修

玄関ホールは、長年の間に様々な表示サインが追加され、また、開館当時にはなかった予約システム端末や券売機、駐車場料金精算機があとから設置されたことで、はじめて訪れた利用者にとってはわかりにくい空間となっている。

また、中央通り側の出入口から受付カウンターの視認性が悪く、サインの再配置や統一したインテリア計画、受付を正面玄関側に出す配置等を行うことにより、利用者にとってわかりやすい玄関ホールへと改修する必要がある。

○誘導サインや大きなピクトサイン

柱の陰などわかりにくい箇所には誘導サインを設置する。また、トイレやエレベーターなどは、一目でわかる大きさのピクトサインにするなど、誰もがわかりやすい空間に改修する。



大きなピクトサインの例

○明るくわかりやすい受付

現在の受付の位置が出入口から奥まっているので、受付の位置を正面玄関側に拡張し、館内に入った時にわかりやすいよう計画する。また、蛍光灯をLED照明に更新し、明るい受付に改修する。

○野外活動センター事務所の移設

現在3階にある野外活動センターを市民がアクセスしやすい2階へ移設する。コミュニティラウンジと隣接させることで、市民が気軽に訪れることのできる施設に更新する。合わせて中3階にも、自動販売機の設置や椅子やテーブルを置くことで、体育施設を訪れる市民同士の交流が生まれるスペースとなるよう改修する。



1階受付のイメージ図



野外活動センター事務所とコミュニティラウンジのイメージ図

③外構改修

中央通り側の樹木は、定期的な手入れをしているものの、植樹から時間が経ち大きく成長している。中央通りからは武蔵野総合体育館が見えづらい状態となっているため、視認性の高い武蔵野総合体育館の顔づくりが必要である。

○開かれた体育館としての外構

樹木が密集している箇所は間伐を行い、2階コミュニティデッキへ繋がる階段周辺は舗装を広げ、武蔵野総合体育館を訪れる市民が建物を認識でき、来館しやすい明るい外構計画とする。



総合体育館正面イメージ図

IV-4 各諸室の改修内容

基本方針を踏まえた各諸室の改修内容を下記に示す。



メインアリーナ

- ・フローリングの更新を行う。
- ・付随する倉庫は、体育機器、備品の出し入れのしやすい扉となるよう更新する。




軽体操・ダンス室、トレーニング室、卓球場

- ・フローリングの更新を行う。
- ・床材の更新に合わせ、壁面や天井を更新する。
- ・軽体操・ダンス室の移動間仕切り壁を更新する。



玄関ホール・廊下

- ・玄関ホールは、明るさを感じられるような設えに改修する。
- ・受付はわかりやすく、誰でも使いやすい設えに改修する。
- ・親子連れでも訪れやすいよう、授乳室を設ける。

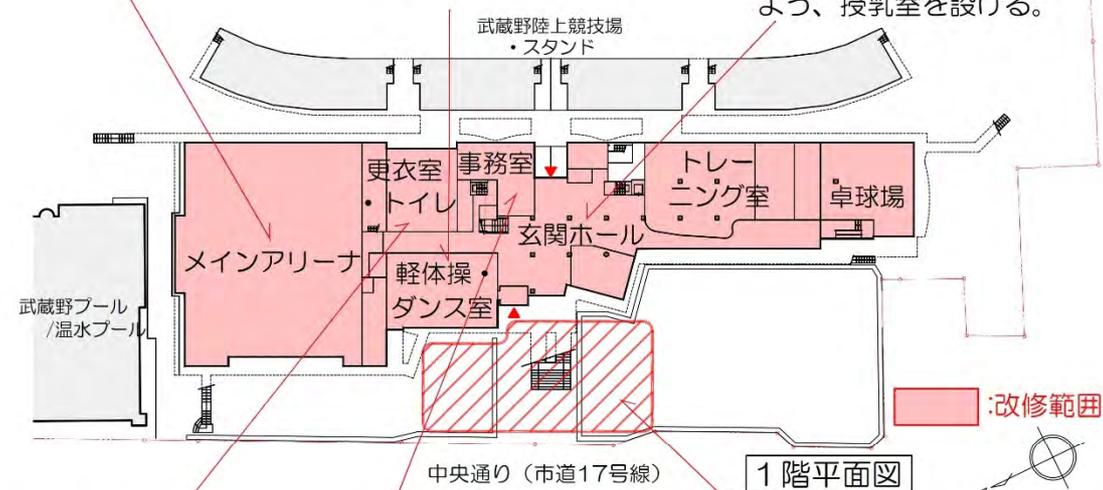

更衣室・トイレ

- ・点在している更衣室・トイレを集約し広く多機能な更衣室・トイレへ改修する。



事務室

- ・業務上必要な面積を確保し、収納スペースを確保する。
- ・OAフロアを導入する。




外構

- ・中央通り側の外構を整え、武蔵野総合体育館の顔づくりを行う。




1階 改修概要

< 改修前 >

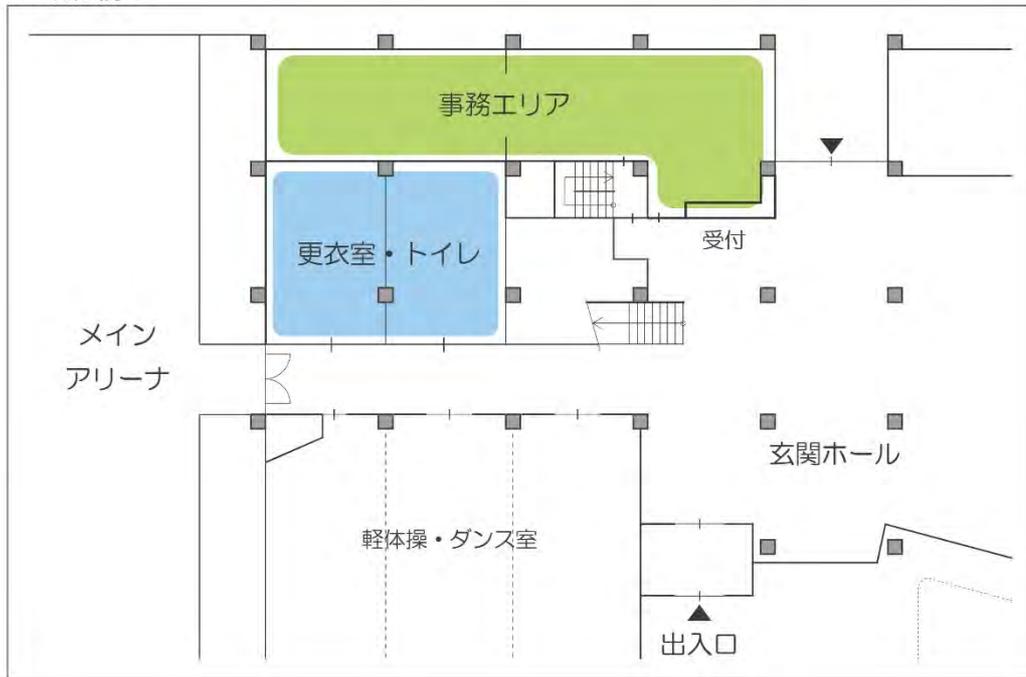

< 改修後 >

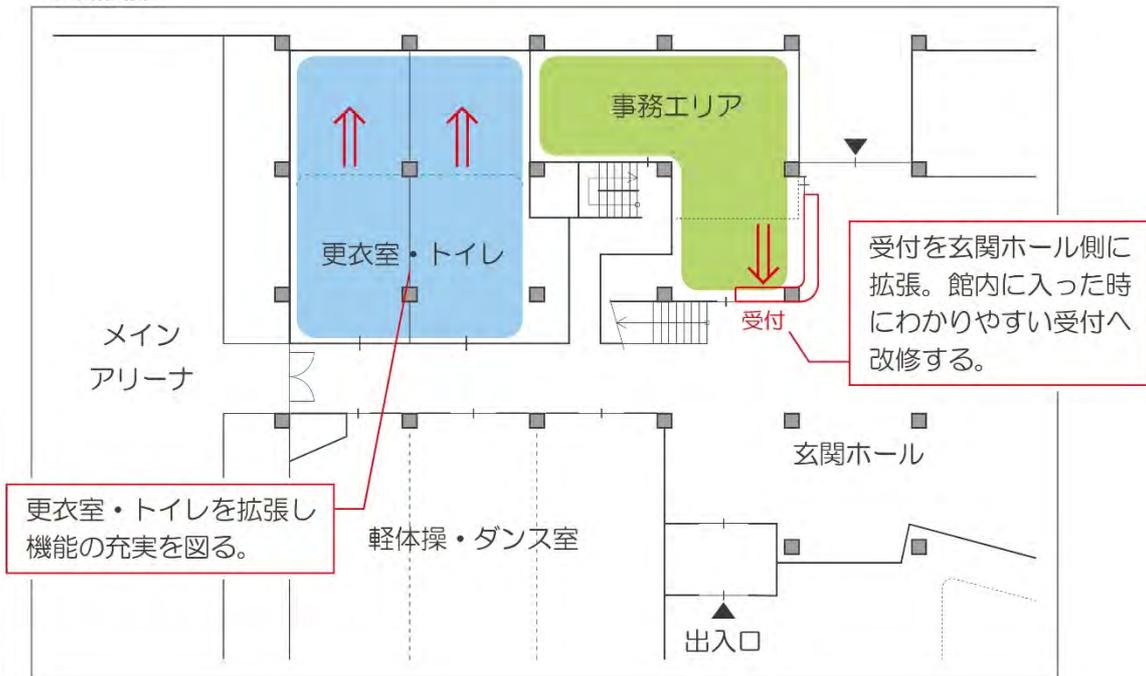

1階 事務エリア、更衣室・トイレ周辺の改修イメージ



メインアリーナ

・劣化した2階席の取り換え、床材の更新を行い、「見るスポーツ」も楽しめる施設にする。




2階コミュニティデッキ出入口

・誰もが使いやすいよう主要な通路は自動扉化などバリアフリーに配慮した改修を行う。



サブアリーナ

・フローリングの更新を行う。
・付随する倉庫は、体育機器、備品の出し入れのしやすい扉となるよう更新する。

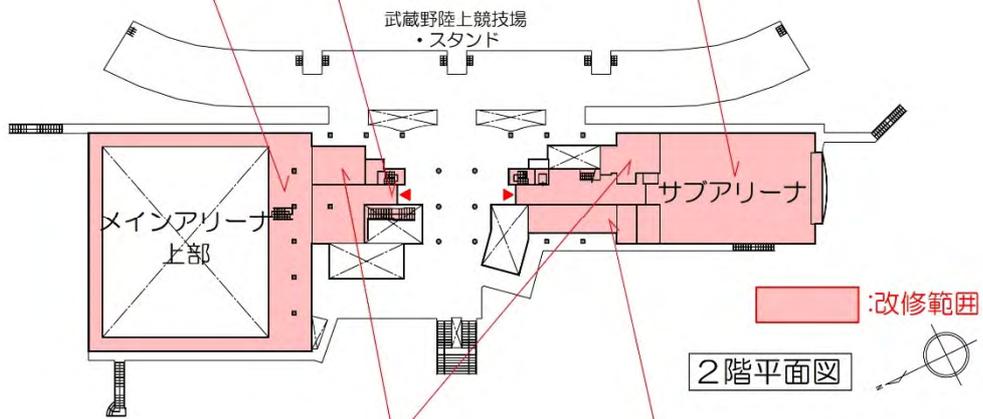


更衣室・トイレ

・広く使いやすい更衣室・トイレへ改修する。


コミュニティラウンジ

・現在使われていない厨房部分に野外活動センターを移設し、コミュニティラウンジと隣接させることで、市民が気軽に訪れることのできる施設に更新する。

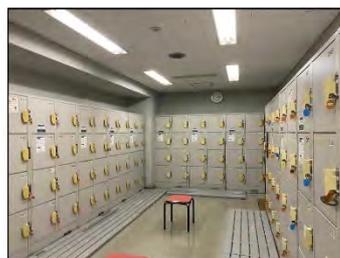


2階 改修概要

< 改修前 >

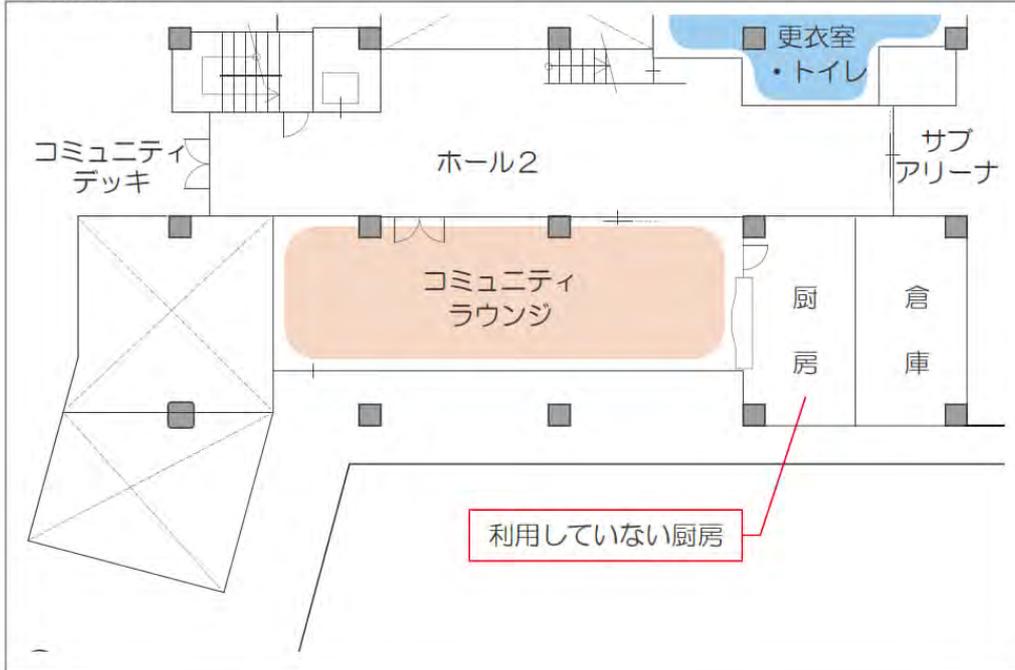

< 改修後 >

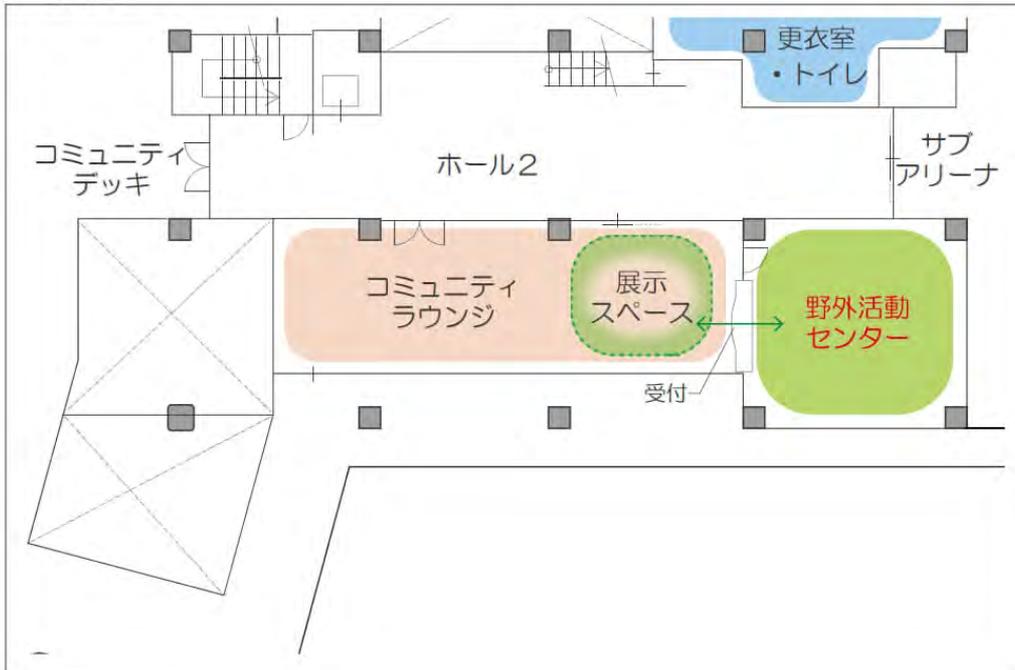

2階コミュニティラウンジ、野外活動センター周辺の改修イメージ



会議室・研修室・書庫等
 ・明るい設えとなるよう内装改修を行う。
 ・野外活動センターが2階へ移設することに伴い、書庫スペースを増設する。




トイレ
 ・3階のトイレは、器具交換、内装改修を行い、アメニティ向上を図る。



中3階
 ・明るい設えとなるよう内装改修を行う。



廊下
 ・明るい設えとなるよう内装改修を行う。

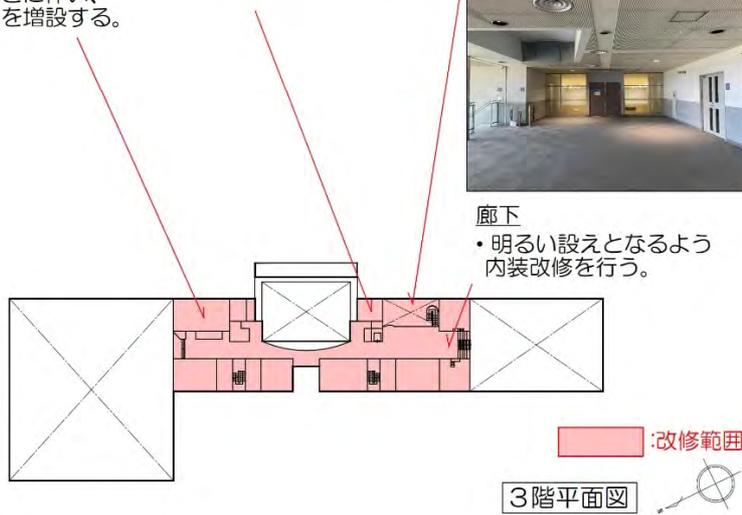

3階 改修概要




柔剣道場
 ・フローリングの更新を行う。
 ・柔剣道場の移動間仕切り壁を更新する。



弓道場
 ・フローリングの更新を行う。



更衣室・トイレ
 ・4階の更衣室・トイレは、器具交換、内装改修を行い、アメニティ向上を図る。

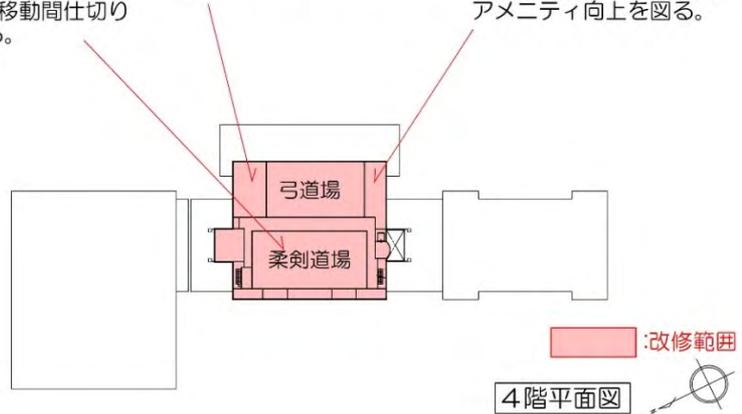

4階 改修概要


V. 今後のスケジュール

V-1 設計及び工事スケジュール

本計画案作成後、基本計画策定を行い、令和6（2024）年度から令和7（2025）年度まで基本設計及び実施設計を行う。着工は令和8（2026）年度、竣工は令和10（2028）年度を予定している。

V-2 全館休館期間

全館休館期間は、令和8（2026）年度から令和10（2028）年度までの16か月間を予定している。

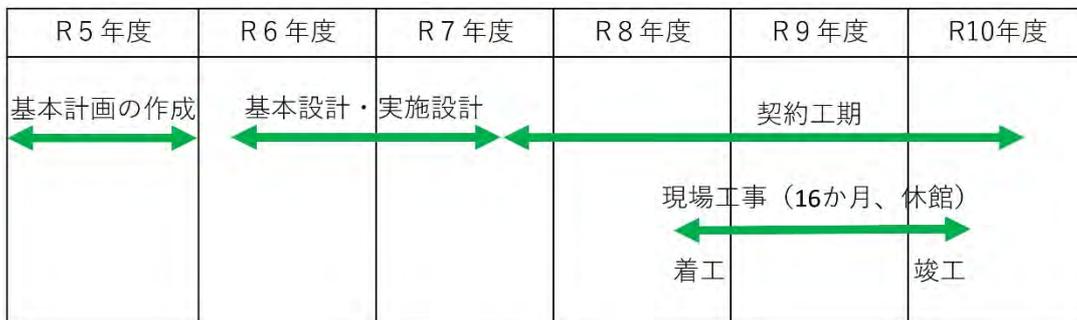

想定スケジュール

V-3 概算工事費

令和5（2023）年時点の概算工事費 約54.4億円（※1）

ただし、業務委託費や備品類及び工事期間中の運営に関する費用は含んでいない。また、物価上昇等で概算費用の変更が生じる可能性もあり、基本設計や実施設計時に改めて精査を行う。

※1：建築工事は㎡単価より算出、設備工事は積み上げにより算出


VI. 計画上の留意点について

VI-1 計画上の留意点

本施設の大規模改修にあたっての特殊要因、留意点について整理した。

①改修工事に伴う武蔵野温水プール、市立第四中学校温水プール、陸上競技場への影響

体育館地下の機械室には、武蔵野温水プールや市立第四中学校温水プールのための機械設備、電気設備も設置されており、体育館設備と同様に耐用年数を超えている。また、陸上競技場への温水も供給している。体育館休館に伴い、上記施設への温水供給が一定期間停止することが想定されるため、各施設関係者と調整が必要である。

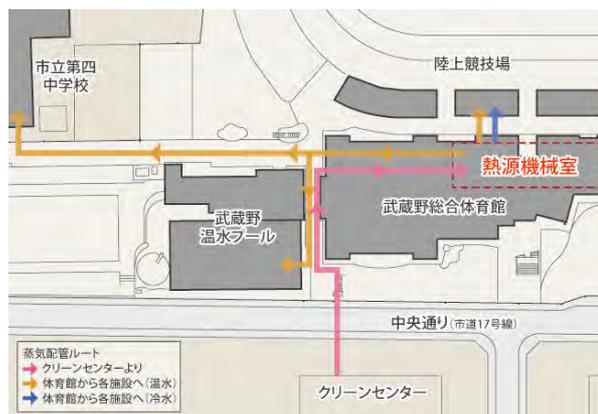

蒸気配管ルート図

②事務受付機能の継続

総合体育館の運営を受託する公益財団法人武蔵野文化生涯学習事業団は、工事期間中も稼働可能な施設（市営プール、陸上競技場、軟式野球場、庭球場、緑町スポーツ広場、ストリートスポーツ広場、中央公園スポーツ広場）の受付業務やスポーツ教室の開催、本部運營業務などこれまでと同様の業務を行う。また、改修工事期間中も市民がスポーツを実施する機会を創出するため、スポーツ教室等については市内の小中学校やコミュニティセンターなどを活用した事業運営を行うため、仮設の受付窓口及び職員事務所については体育館敷地内等に設置することが望ましい。

③市道 17 号線無電柱化事業との調整

当敷地の前面道路である市道 17 号線については無電柱化事業を検討中であることから、施工計画においては、本計画の工事車両と無電柱化工事が干渉しないようスケジュール調整が必要である。

④災害時の役割について

武蔵野市地域防災計画に位置付けられている災害時の総合体育館の緊急物資輸送拠点やボランティア宿泊施設として位置づけは、今回の大規模改修後も変更はない。現在想定されている災害時の役割を果たせるよう、保全改修工事においても可能な範囲での改修を行うことが必要である。

VII. 意見聴取（パブリックコメント）の実施と市の対応方針

VII-1 意見聴取（パブリックコメント）の実施概要

①募集期間

令和5（2023）年12月15日（金）から、令和6（2024）年1月4日（木）まで

②提出方法

郵送・電子メール・ファクス・意見提出フォームまたは直接持参

③実施結果

51名から計122件の意見提出（一部内容により1通のご意見を項目ごとへ分類している）

VII-2 意見内容と市の対応方針

No	対象箇所		ご意見 ※個人情報を除き、原則原文のまま記載（誤字等と見受けられるものは一部修正）	市の対応方針
	大項目	小項目		
1	I. 基本計画策定に至る背景と位置づけ	I-1 計画策定の背景・目的	<p>【I-1 計画策定の背景・目的】、</p> <p>【II-1 武蔵野総合体育館の周辺環境】</p> <p>第二期武蔵野市スポーツ推進計画中の武蔵野市立体育施設類型別施設整備計画にあるとおり、総合体育館周辺はスポーツ施設の集積地であり、中心にある総合体育館は施設間を有機的につなげる役割を持っています。特に、併設する陸上競技場や温水プールと一体的な利用ができることは、本市のスポーツ施策におけるメリットとも言えます。30年以上前の建設当時に、「障害者の利用」、「幼児から高齢者まで」、「屋内と屋外を利用</p>	ご意見を基に、基本計画「I-1 計画策定の背景・目的」を修正いたしました。

		<p>きる」、「野外活動・野外スポーツの振興」等々考え、近隣自治体の中でも高水準なスポーツ施設を構想し、市域に分散せず集約して整備し、さらに今日まで維持してきたことによって、現在、様々な恩恵を受けています。</p> <p>物価高騰などによる工事単価の増など、引き続き厳しい状況ではありますが、スポーツは、子育て、教育、障害者・高齢者福祉、交流、観光、まちづくり、環境…他分野へ波及効果をもたらすことができます。今回の大規模改修は単なる保全工事という位置づけだけではなく、20年、30年後の市民にも愛され親しまれる市民施設となるよう、どのように改修するかが肝要です。</p> <p>さらに、メインアリーナは本市公共施設の中でもフラットでかつ最も広い空間を有しており、災害時には総合体育館が物資輸送拠点及びボランティア宿泊施設等となることや、新型コロナウイルス感染症発生時にワクチン接種会場になったことから、総合体育館は市政運営において重要な施設の一つと言えます。</p> <p>スポーツの価値観の多様化、スポーツ施設の役割や可能性の広がりに関する記載や、本市における総合体育館の意義について追記していただきたい。</p>	
--	--	---	--

2	Ⅱ. 武蔵野 総合体育館 の概要、現 状と課題	Ⅱ-3 施設 概要	<p>【Ⅱ-3 施設概要 ③利用者数】</p> <p>【Ⅱ-4 施設の現状】</p> <p>利用者数や種目、用途だけでは伝えきれない利用状況として、練習や市民大会の実施といった日々の市民スポーツの場であることに加えて、スポーツ祭東京2013（国民体育大会）、日本初のボッチャ世界大会、RWC 2019™チームキャンプ、海外選手の強化合宿等々の全国的・国際的なスポーツイベントの開催が挙げられます。市民にとって親しみある施設が市民と世界との交流結節点になり、スポーツを通して、国籍、言語、国境、宗教、人種などを超えて交流を育んでいることも大切な観点です。</p> <p>また、子どもや高齢者、障害者など、移動が困難な方にとって、総合体育館のように身近な場所でスポーツを体感できる機会、アスリートと触れ合うことができる機会、観る機会はとても貴重であり有意義です。</p> <p>高い水準の施設だからこそ、全国的・国際的なイベントが誘致でき、誘致したことによって生み出される付加価値を市民へ還元できることも市民施設の役割です。</p>	<p>ご意見を基に、基本計画「Ⅰ-1 計画策定の背景・目的」を修正いたしました。</p>
---	----------------------------------	--------------	--	--

3	IV. 改修内容について	IV-1 『劣化保全整備』の改修内容	<p>メインアリーナ：フローリング更新に際し、バドミントンコートを一2面にしたい。現在の10面を3分の1や2分の1で借りた場合、半端に出来ないコートができ、利用料に対し不公平を感じている。</p> <p>得点盤がコート上にあり、シャトルが当たるので位置を変更してほしい。</p>	<p>バドミントンコートについては、現状は1/3で2面、1/2で4面、2/3で6面、全面で10面です。コートの配置、また得点盤の位置に関しましては、利用者の安全を考慮したうえでご意見を踏まえ設計段階で検討してまいります。</p>
4	IV. 改修内容について	IV-1 『劣化保全整備』の改修内容	<p>メインとサブアリーナの仕切りネット：どちらも端がきちんと閉まりきらないので、隣を使用している球技団体のボールがバドミントンコート内に侵入し大変危険。</p> <p>またサブアリーナのネットは、下が余っていて床に広がっているため、コート後方に下がった時、ネットに乗って足を滑らせて転倒するバドミントンプレイヤーもいて危険を感じている。</p> <p>仕切りの素材や形状など検討してほしい。</p>	<p>仕切りの素材や形状に関して、ご意見を踏まえ設計段階で検討してまいります。</p>
5	IV. 改修内容について	IV-1 『劣化保全整備』の改修内容	<p>メインアリーナ観覧席：観覧席上部の空間を利用し、3階からの入り口を設け、既存の座席の頭上に新たな座席を増設してほしい。新しい座席にはドリンクホルダーを設置してほしい。</p> <p>また、アリーナに通じる階段が現</p>	<p>選手控席の上部増設、階段について、本工事は保全改修のためご要望に応えることは難しいと考えています</p>

			<p>在真ん中に一つだけだが、両サイドなどに増設し、観客席とアリーナの行き来をしやすくしてほしい。</p>	<p>が、今後の施設整備に関するご意見として承ります。</p> <p>また、ドリンクホルダーの設置については、必要な座席数を考慮しつつ、ご意見を踏まえ設計段階で検討してまいります。</p>
6	IV. 改修内容について	IV-1 『劣化保全整備』の改修内容	<p>4階剣道場の床を今のツルツル光り滑らないニスを塗った床から、剣道場本来のニスを塗らなくて滑る床にしてもらいたい。今のままだとアキレス腱を痛めるものも出てくると思われるのでこの機会に交換してもらいたい。</p>	<p>ご意見を踏まえ剣道利用時の安全性に配慮した改修計画を進めてまいります。</p>
7	IV. 改修内容について	IV-1 『劣化保全整備』の改修内容	<p>施設の現状(剣道場4F)についての要望になります。</p> <p>長年に渡り、武蔵野市民体育館を使用させて頂き、また施設職員の皆様には大変お世話になりました。ありがとうございます。</p> <p>このたび大規模改修工事が計画される予定との事で、剣道場の床について一意見をお聞き頂きたいと思いました。</p> <p>実は現在の市民体育館4F 剣道場はニスが全面的に綺麗に施され、剣道場だけでなく、多目的に応用出来る広いスペースになっています。</p> <p>もちろんこれは十分承知しておりますが、剣道の稽古や試合には床</p>	<p>No.6をご参照ください。</p>

			<p>の状態の影響が大きく、足の指が引っ掛かりの怪我や滑っての転倒、危険な事も実際に起きております。</p> <p>ご指導にあたって下さる先生方、先輩方も注意しながら稽古されている現状です。</p> <p>今回、僣越ながらお願い申し上げたい事は、この先の未来に長く老若男女が安心して稽古出来るような、剣道に適した床を持つ剣道専門のスペースの確保と設置を何卒よろしくお願い申し上げます。</p>	
8	IV. 改修内容について	IV-1 『劣化保全整備』の改修内容	<p>各諸室の改修内容に剣道場のフローリングの更新が予定されていますが、剣道に適した床に改修お願いいたします。</p> <p>体育館がオープンした当初は剣道の基本動作スリ足がとてもしやすい床だったそうですが、他の競技で使用している団体から滑りやすいとのクレームがあり、オープン後に床が滑りにくいように塗装が施されたと聞いております。</p> <p>これまでも毎年行われている事業団との懇談会で床の改修をお願いしてはいましたが、今回の大規模改修を機会に床の改修をお願いいたします。</p> <p>現状では子供達に剣道の基本動作であるスリ足を指導する際に上手く足を滑らせる事が出来ず、どうしても床から足を離しての動作になり、剣道の1番の基本動作であるスリ足の指導がし難くなっております。また、踏み込んで打ち込</p>	No.6をご参照ください。

			<p>んだ後、打突の勢いのまま前進する際に足を滑らす事が出来ず、急な制動がかかり足の指を痛めてしまう事例も出ております。</p> <p>オープン当初の様な床に戻して欲しい事が希望ですが、他の競技での使用もありオープン当初の様な仕様は難しいのであれば、現状の塗装を見直しもう少し足を滑らせることが出来るような床に改修お願いいたします。</p>	
9	IV. 改修内容について	IV-1 『劣化保全整備』の改修内容	<p>4階剣道場について。フローリングの改修の際、現在は剣道に適さない非常に滑りにくい床になっています。他の施設（第四中学校の武道場や外部の剣道場など）と比べても動いていてケガにつながりやすいと感じます。</p> <p>他の競技にも使われているためと思いますが、剣道場は剣道に一番適していてほしいと思います。ご検討くださいますようお願い申し上げます。</p>	No.6をご参照ください。
10	IV. 改修内容について	IV-1 『劣化保全整備』の改修内容	<p>4階剣道場の床について、現在はニス塗られていて剣道には適しておりません。改修を要望します。</p>	No.6をご参照ください。
11	IV. 改修内容について	IV-1 『劣化保全整備』の改修内容	<p>毎週、4階剣道場を使用させて頂いて剣道の稽古をしています。現在の剣道場の床は固く、加えてニスがしっかり塗ってあるため、足が引っかかって危険だと感じています。転倒したり、肉離れや指を巻き込まれての骨折の原因となっています。特に湿気の多い季節</p>	No.6をご参照ください。

			は顕著あるため、剣道に相応しい床への改修をお願い致します。	
12	IV. 改修内容について	IV-1 『劣化保全整備』の改修内容	剣道場の床を柔らかい素材にして頂きたいです。	No.6をご参照ください。
13	IV. 改修内容について	IV-1 『劣化保全整備』の改修内容	4階の剣道場の床を稽古の際に支障が無いようにしてください。	No.6をご参照ください。
14	IV. 改修内容について	IV-1 『劣化保全整備』の改修内容	<p>色々とお世話になり、誠にありがとうございます。</p> <p>私は、剣道を武蔵野剣道連盟の合同稽古や仲間で作った稽古会で、総合体育館4階の剣道場で稽古をさせていただいてます。本剣道場ができた当時の床は、剣道のすり足、足さばき等がスムーズ（床を滑るよう）にできました。しかし、ある時、床にワックスが塗られ、すり足等を行うと足裏が床にくっつき、ストッパーがかかる感じで前のめりに倒れそうになります。本剣道場は、大人だけでなく子供使います。床の仕上げが、前記のように非常に危ない状態になっています。是非、本剣道場ができた当時の床にさせていただきたく、よろしくお願い申し上げます。</p>	No.6をご参照ください。

15	IV. 改修内容について	IV-1 『劣化保全整備』の改修内容	IV-4) 4階柔剣道場の床についてフローリングの更新を行うとありますが、現在の剣道場の床はワックスを塗られており剣道をするにはとても危険な床（滑らなさすぎてつまずく、足をひねる、爪が剥がれる）なので、是非剣道場の床は素足で安心安全に剣道ができる床に直していただきたいです。	No.6をご参照ください。
16	IV. 改修内容について	IV-1 『劣化保全整備』の改修内容	<p>4階弓道場についての要望です。</p> <p>1、冷房暖房吹き出し、床暖房、扇風機天井角等、防寒用シートの設置</p> <p>昨今の気象事情が年々厳しくなっており、暑さ、寒さ対策が必須です。現在は扇風機、電気ストーブの対応となっておりますが健康的な練習に至っていない状況です。また、冬季はビニールカーテン対応としていますがこちらもビニールの経年劣化が進んでいます。現在のカーテン式は、強風時におもりがあおられて危険を感じる時もあるという現状です。剣道場同様な冷房暖房吹き出しの設置、他道場のような床暖房、扇風機の天井付近設置をお願いします。</p> <p>また、冬季のビニールシートの交換設置(おもりを使わないもの希望)、併せて電気の容量変更(アンペア数の増加)を要望します。床暖房(例:東京武道館、駒沢公園弓道場)、冷房吹き出し(例:府中総合体育館弓道場)</p> <p>2、道場内、矢道の照明をLEDに交換</p>	弓道場の冷暖房設備や照明設備等について、利用者の利便性、快適性を考慮し、施設の運用面も含めて、ご意見を踏まえ設計段階で検討してまいります。

		<p>日が落ちてからの練習、悪天候時、矢道の照明が故障しても取り替えが出来ません。道場内、廊下含めて暗いため、LED への交換を要望します。</p> <p>3、廊下側看的の得点掲示アクリル板の入れ替え 現状亀裂が入っており、危険な状態です。また取り外しが出来ないため掃除が出来ず射場が見えにくく、機能していない状況です。交換を要望します。</p> <p>4、矢道廊下側に設置されている金網の改修 枯れ葉などゴミが溜まって掃除が出来ません。矢などが乗った際に上に乗れないため、破損の恐れもあります。</p> <p>5、外側看的室の入り口の段差の改修 段差が高く、過去にけがをした事例もあり、危険です。</p> <p>6、外側看的室の雨天時の浸水の防止 雨天時には看的室の床が水浸しとなります。何度か改修を要望していますが、改修時に防水を強化するなど浸水防止対策を要望します。</p> <p>7、外側通路に水場（蛇口付のシンクなど） 現在水栓のみですが、散水用の他にシンク付き水栓を要望します。</p>	
--	--	---	--

17	IV. 改修内容について	IV-1 『劣化保全整備』の改修内容	「劣化保全整備」について、大勢の人が参集している際に大地震が発生しても対応できるよう、非常用発電設備、非常照明等の設備を充実させて欲しい。近隣から、避難者が総合体育館に集まってくる事も、容易に想像できる。	No.79 をご参照ください。
18	IV. 改修内容について	IV-1 『劣化保全整備』の改修内容	ダンス室は、裸足で踊っても安全なフローリング希望。鏡を全室設置。三分の一ごとに区切って利用は今まで通りにして欲しい。	1階軽体操・ダンス室の床はダンス利用時の安全を考慮した設計を進めてまいります。 また、現状中央の部屋は可動壁のため鏡が無く移動鏡で運用している状況ですが、鏡設置に関してはご意見を踏まえ設計段階で検討してまいります。
19	IV. 改修内容について	IV-2 『改良保全整備』の改修内容	《トイレ》 全体的に古いという印象は拭えない。数が足りていないことも問題と考える。	基本計画「IV-2 『改良保全整備』の改修内容②更衣室・トイレのアメニティ向上」に記載されている方針を基に、ご意見を踏まえ、設計段階で検討してまいります。

20	IV. 改修内容について	IV-2 『改良保全整備』の改修内容	2階メインアリーナ側フロア：大会利用の際、観覧席分の人数が利用するにはトイレの数が少なすぎる（現在女子トイレは2つ）また、観覧席を選手が利用することもあるので、2階にもメインアリーナ用更衣室を新規に設けてほしい。	No.19 をご参照ください。
21	IV. 改修内容について	IV-2 『改良保全整備』の改修内容	p.24 IV-2 『改良保全整備』の改修内容 ②更衣室・トイレのアメニティ向上 について。 多目的トイレには、成人が横になっておむつ交換ができるベッドの設置をお願いします。	No.19 をご参照ください。
22	IV. 改修内容について	IV-2 『改良保全整備』の改修内容	p.24 IV-2 『改良保全整備』の改修内容 ②更衣室・トイレのアメニティ向上 について。 授乳室だけでなく、おむつ替えスペースの増設もお願いします。おむつ替えスペースが多目的室トイレにしかない、使用中でおむつ交換が間に合わなかったり、逆に汚れなどでおむつ替えに時間がかかる場合、多目的トイレしか使えない方に迷惑をかけてしまう可能性があります。	No.19 をご参照ください。
23	IV. 改修内容について	IV-2 『改良保全整備』の改修内容	「IV-2 ②更衣室・トイレのアメニティ向上」について ロッカーを大きいものに変えて欲しい。 1つずつのスペースがもう少し広いと厚手の上着も楽にしまえるので助かる。	No.19 をご参照ください。

24	IV. 改修内容について	IV-2 『改良保全整備』の改修内容	p.24 IV-2 『改良保全整備』の改修内容 ②更衣室・トイレのアメニティ向上 について。 使用後のおむつ(乳幼児・成人とも)や尿漏れパッドを捨てられるように、すべてのトイレに専用ゴミ箱を設置してください。武蔵野市は使用後のおむつは無料で回収していることを考えると、市内公共施設で捨てられない理由はないように思います。	現状、設置している箇所もありますが、運用面も含め、ご意見を踏まえ設計段階で検討してまいります。
25	IV. 改修内容について	IV-2 『改良保全整備』の改修内容	IV-2 『改良保全整備』の改修内容 バリアフリー化の推進…施設の開設計画当初から大きく変化している現在の社会情勢下では、障害者含め老若男女誰もが利用しやすい施設とするためのユニバーサルデザインによるバリアフリー化が必須と考える。自動ドアや引き戸、弱視者対応のデザインなど誰もが訪れて生き活きと施設を活用できるようになることを願っています。	基本計画「IV-2 『改良保全整備』の改修内容 ①バリアフリー化の推進」に記載されている方針を基に、ご意見を踏まえ、設計段階で検討してまいります。
26	IV. 改修内容について	IV-2 『改良保全整備』の改修内容	「改良保全整備」について、特に水回りの老朽化や、ユニバーサルデザインへの取り組みの遅れを感じる。改修にあたり、犯罪(特に性犯罪)防止の視点からの検討も必要だと思う。	No.19、No.25 をご参照ください。
27	IV. 改修内容について	IV-2 『改良保全整備』の改修内容	p.23 IV-2 『改良保全整備』の改修内容 ①バリアフリー化の推進 について。 車いすでは問題ない段差でも、歩行器や高齢者手押し車等を使用する際に車輪がつかえてしまうことがある。特にタイル状に切り分け	No.25 をご参照ください。

			<p>られている、表面が滑らかになっていない石を敷き詰めたような床面は、つかえた際につんのめって転びそうになり大変危険です。床材を選ぶ際には車いす基準よりも更に段差の少ない床材の選定をお願いします。</p>	
28	IV. 改修内容について	IV-2 『改良保全整備』の改修内容	<p>平成元年の竣工ということで、やはり第一にバリアフリーの面での使い勝手の悪さは改善が絶対必要だと思います。EVに関しても同様です。</p>	No.25 をご参照ください。
29	IV. 改修内容について	IV-2 『改良保全整備』の改修内容	<p>IV-2 『改良保全整備』の改修内容 ①バリアフリー化の推進 →こちらは、誰もが利用しやすいようにぜひ力を入れてほしい。</p>	No.25 をご参照ください。
30	IV. 改修内容について	IV-2 『改良保全整備』の改修内容	<p>p.23 IV-2 『改良保全整備』の改修内容 ①バリアフリー化の推進について。 発達障害や自閉症の人がパニックを起こした際に使える、クールダウン・カームダウンスペースの設置をお願いします。 (参照) https://www.sankei.com/article/20230919-71V6X7H4PZOXJGKMVM2ZEA6YPA/</p>	<p>クールダウン・カームダウンスペースについては、設置スペースや場所も含め、ご意見を踏まえ、検討してまいります。</p>
31	IV. 改修内容について	IV-3 『機能維持・向上工事』の改修内容	<p>《昇降機》 柔道場からの救急搬送が困難であることへの対応は是非お願いしたい。 昇降機自体の台数が足りておらず、速度も遅いので大会などの開催の際は非常に困ることも多い。</p>	<p>現状の建物の構造上、エレベーターの台数を増やすことは難しいと考えますが、ストレッチャーが入ること</p>

			階段も入り組んでいるため緊急避難時には混乱しそうである。	のできるエレベーターへの改修や、速度を上げることで待ち時間を短縮する工夫をまいります。また、誘導サインや案内を適切に設けて、わかりやすく使いやすい施設になるよう改修を進めてまいります。
32	IV. 改修内容について	IV-3 『機能維持・向上工事』の改修内容	エレベーターがなかなか来ない、フロアが分かりづらい	No.31 をご参照ください。
33	IV. 改修内容について	IV-3 『機能維持・向上工事』の改修内容	<p>IV-3 『機能維持・向上工事』の改修内容</p> <p>①昇降機設備の更新…エレベーター内の狭さについて不便さを感じているとともに、ストレッチャーが入れない現在の寸法から広げてもらうことで救急時にも対応できるようになるため、市民がより安心して施設を使用できるようになると感じました。</p> <p>幼い頃から慣れ親しんだ施設で、私自身がスポーツを好きになるきっかけとなった施設です。今後も武蔵野市のランドマークの一つとして、大規模な改修により誰もが利用しやすく愛される施設となるよう切に願っております。関係者</p>	No.31 をご参照ください。

			の皆様どうぞよろしくお願い致します。	
34	IV. 改修内容について	IV-3 『機能維持・向上工事』の改修内容	エレベータは2つあると良い。(1台だと故障した時に移動ができなくなる)	No.31 をご参照ください。
35	IV. 改修内容について	IV-3 『機能維持・向上工事』の改修内容	「機能維持・向上工事」について、既存のエレベーターは1台のみで定員数が少なく、乗り逃がす事が多い。階段を使用して、上のフロアの目的の場所に行く場合、2Fのコミュニティデッキがあるため館内の構造が複雑で、誘導サインも不十分で迷子になりそうになる。外構に関しては、公共施設の樹木は多ければ多い程良いというものではない。現に、自宅近隣の昔ながらの雑木林は、多くの木を伐採して整備したところ、明るく風通しが良く快適になり利用者が増えた。改修工事後、もっと充実した設備で、明るく親しみやすく、多様な人が利用しやすい総合体育館になることを期待しています。	エレベーターに関しては、No.31 をご参照ください。外構に関しては、No.56 をご参照ください。
36	IV. 改修内容について	IV-3 『機能維持・向上工事』の改修内容	階段を使うと、行き先に迷ってしまう。 非常時に備え階段室にも判りやすい案内図や表示盤などがあったら良いと思う。	基本計画「IV-3 『機能維持・向上工事』の改修内容 ②サインのリニューアルと内装改修」に記載されている方針を基に、誘導サインや大きなピクトサインの導入、明る

				くわかりやすい 受付の改修等、 ご意見を踏ま え、設計段階で 検討してまいり ます。
37	IV. 改修内 容について	IV-3 『機 能維持・向 上工事』の 改修内容	計画案の現状の写真を拝見して、 思っている以上に老朽化が進んで いることが分かりました。利用す る立場として気になっていた事 は、ほぼ 11 ページに記載の課題 通りでした。トイレ、更衣室の使 いにくさ、玄関の暗さ、入ってす ぐ、どこに何があるのか分かりに くい建物構造、案内表示の少な さ、小さいエレベーターなど。加 えて、トレーニング室の暗さと古 さは気になっていました。改修で 使いやすくなることを楽しみにし ています。	No.36 をご参 照ください。
38	IV. 改修内 容について	IV-3 『機 能維持・向 上工事』の 改修内容	計画案の 29 ページの野外活動セ ンター事務所とコミュニティラウ ンジの案が素敵だと思います。 3 階は薄暗く、やかつも体育協会 もなんとなく暗いし、入りにくい 感じがあったので。 コミュニティラウンジも図書室だ ったときからなんとなくもったい ない空間だったので素敵な市民の ためのスペースとなると嬉しいで す。 2 階の喫茶スペースも軽食がとれ る、親子で使える、学生が集える スペースとなることを期待しま す。 1 階のキッズスペースは入園前の	No.19、 No.36、 No.71 をご参 照ください。

			<p>お子さんをもつお母さん達のために今までのようなスペースがあるといいと思います。</p> <p>慣れていないと各エリアがわかりにくいので案内表示をわかりやすく大きくできたらいいと思います。</p> <p>更衣室もシャワー室など、清潔感のあるキレイなものになるといいと思います。</p> <p>よろしくお願いします。</p>	
39	IV. 改修内容について	IV-3 『機能維持・向上工事』の改修内容	受付を玄関入ってすぐのわかりやすい場所に設けて欲しい	No.36 をご参照ください。
40	IV. 改修内容について	IV-3 『機能維持・向上工事』の改修内容	講座や市内の運動できる場所、機会について相談できるカウンターがあると良い	No.36 をご参照ください。
41	IV. 改修内容について	IV-3 『機能維持・向上工事』の改修内容	全体的に照明を明るく柔らかくして欲しい	No.36 をご参照ください。
42	IV. 改修内容について	IV-3 『機能維持・向上工事』の改修内容	階段に消費カロリーを書いてほしい。	No.36 をご参照ください。
43	IV. 改修内容について	IV-3 『機能維持・向上工事』の改修内容	体育室やランニングコースの広さや外周距離を目立つところに掲示してほしい	No.36 をご参照ください。
44	IV. 改修内容について	IV-3 『機能維持・向上工事』の改修内容	案内表示を大きくわかりやすく掲示してほしい。	No.36 をご参照ください。

45	IV. 改修内容について	IV-3 『機能維持・向上工事』の改修内容	建物の老朽化によるものが大きいと思われるが、全体的に「暗い」イメージ。	No.36 をご参照ください。
46	IV. 改修内容について	IV-3 『機能維持・向上工事』の改修内容	<p>P28②サインのリニューアルと内装改修について</p> <ul style="list-style-type: none"> ・どこの施設がどこにあるのか一目で分かる案内図（マップ?）がほしい。 ・さらに各施設で何が行われているのかが分かるようにしてほしい。大会や教室など。 ・上記の表示が、館内（ロビー）に入った際に分かりやすい場所がないと意味がない。予定についてはシステムとの連動でデジタル表示をお願いします。 ・英語表記ややさしい日本語などの標準的なサインは最低限望みます。 	No.36 をご参照ください。
47	IV. 改修内容について	IV-3 『機能維持・向上工事』の改修内容	<p>体育館に入った時の印象がとにかく「暗い(もしくは薄暗い)」ので、スポーツのための施設という性質からほど遠い。照明ももう少し明るくしたほうがいいのでは?(照明が黄色っぽい?)</p>	No.36 をご参照ください。
48	IV. 改修内容について	IV-3 『機能維持・向上工事』の改修内容	<p>何がどこにあるのか一目でわかるような、もっと大きくてわかりやすい館内案内図を入口において欲しい。</p>	No.36 をご参照ください。
49	IV. 改修内容について	IV-3 『機能維持・向上工事』の改修内容	<p>IV-3 『機能維持・向上工事』の改修内容</p> <p>②サインのリニューアルと内装改修</p> <p>→入館したときにデジタルサインページなどですべての情報が入るよ</p>	No.36 をご参照ください。

			うなしくみにしてほしい。 →ピクトグラムを取り入れるとのことですが、外国籍市民への配慮もぜひ。	
50	IV. 改修内容について	IV-3 『機能維持・向上工事』の改修内容	P28 サインのリニューアルと内装改修について。エレベーターを使用せずに階段のみで3～4階を利用する場合、階段の位置がバラバラであったり、途中でM2階?があったりしてわかりにくいと感じています。災害時の避難等、エレベーターを使えない状態でも誰でも迷わず脱出できるような案内サインなどがあるとありがたいです。	No.36 をご参照ください。
51	IV. 改修内容について	IV-3 『機能維持・向上工事』の改修内容	○明るくわかりやすい受付とてもいいと思います。バブル期のコンクリート基調の冷たい感じのものでなく、自然光や木を取り入れたあたたかみのあるものになるとありがたいです。ひとけのない3階や自販機のある元食堂スペースなども防犯上からもさみしいものでなくなることを希望します。	No.36 をご参照ください。
52	IV. 改修内容について	IV-3 『機能維持・向上工事』の改修内容	IV-2 『改良保全整備』の改修内容、IV-3 『機能維持・向上工事』の改修内容 昨今増加している外国人への対応にも配慮した改修としてほしい。 必要な場所での案内板の外国語(英・中など)併記、「やさしい日本語」やピクトグラムの活用、また受付などでは外国語翻訳アプリなどを活用して、外国人でも気軽に利用できる環境を整えていただき	No.36 をご参照ください。 トイレについては、No.19 をご参照ください。

			たい。 トイレについても、今や日本人でも和式トイレは敬遠されると思うが、配慮が必要と考える。	
53	IV. 改修内容について	IV-3 『機能維持・向上工事』の改修内容	3階の廊下は全体的に暗い印象なので、明るいLEDにしてほしい。	No.36 をご参照ください。
54	IV. 改修内容について	IV-3 『機能維持・向上工事』の改修内容	サインのリニューアルと内装改修…施設開設から30年以上が経っており、この間様々なサインや機器が追加されているため、初めて訪れた利用者がわかりづらい空間になっています。加えて薄暗いため、営業しているか否かすらまで戸惑うこともあります。玄関ホールや館内が明るい雰囲気になり、わかりやすい大きなサインを掲示することなど大幅に内装改修することで、より愛される施設にしていきたいと思えます。	No.36 をご参照ください。
55	IV. 改修内容について	IV-3 『機能維持・向上工事』の改修内容	<ul style="list-style-type: none"> ・前提として（躯体には手を付けないことから改修だけではかなり限界はあるかと思えますが）利用者における全体の動線→施設全体レイアウトならびに使い勝手の向上を視野に置いた改修をお願いします。 ・改修保全を進める上で『ハード（設備）』と『ソフト（視認性、情報 etc）』の両面からの対応が必要かと考えます。 ※ソフト（視認性）・・・サイン看板の統一、サインフォントの大きさ、サイン版カラー ※ソフト（情報）・・・施設予約・ 	No.36 をご参照ください。

			<p>使用状況のデジタルサイネージ（ディスプレイ）などIT機能を使った利用者利便性の向上</p> <ul style="list-style-type: none"> ・現状、全体的にかなり暗いので明るい工夫（照明）に・・・LEDで解決？ 	
56	IV. 改修内容について	IV-3 『機能維持・向上工事』の改修内容	<p>IV-3 『機能維持・向上工事』の改修内容 ③外構改修 ○開かれた体育館としての外構</p> <p>「樹木が密集している箇所は間伐を行い、2階コミュニティデッキへ繋がる階段周辺は舗装を広げ、武蔵野総合体育館を訪れる市民が建物を認識でき、来館しやすい明るい外構計画とする。」への意見</p> <p>植栽や樹木を減らすこと、舗装を広げることは反対です。</p> <p>生まれてからずっと吉祥寺北町及び中町に居住していますが、年を追うごとに、目に見えて市内から緑が減っています（相続時に庭や生垣を維持できない土地が増え、土地の切売り・戸建の密集や、マンション建設を招いているためではと推察）。とりわけ夏場は、舗装やコンクリートの建築物に蓄熱された熱が、夜間に放出されている実感を強くしています。</p> <p>私有地については、切り売りされ、緑が減ることは、ある程度止むを得ない（止められない）部分があるかもしれませんが、せめて市有地や公共施設においては、貴重な木陰と土を維持してほしいです。グリーンパーク緑地（関前）</p>	<p>緑は市民の共有財産という理念のもと、市では緑の保全に努めていますが、大木や古木等の落葉や枯枝等に関する相談は年々増加傾向にあり、自然樹形を大切にしたい樹木管理を継続していくことは難しい状況にあります。今回の外構改修においても、樹木診断の実施や倒木のおそれがある不健全樹木の適切な保全、風水害や雪害に耐えられるよう樹種にあった定期的な剪定を実施し、緑の保全と管理に努めつつ、「IV-3 『機能維持・向上工事』の改修内容 ③</p>

			<p>も、以前あった低木が切り開かれて遊具が置かれ、夏の日差しを防げなくなってしまいました。これ以上、輻射熱を増やすような計画には反対です。</p> <p>「武蔵野の林に囲まれた体育館」という現在の印象に、体育館使用の上での問題があるとは思えません。体育館の前を整備するとしても、現状の緑と土を維持し、整理し直すような、土と水、涼やかさを維持した計画となることを願います。</p>	<p>外構改修」の方針に基づき、来館しやすい明るい外構計画を進めてまいります。</p>
57	IV. 改修内容について	IV-3 『機能維持・向上工事』の改修内容	<p>○外構改修、市道 17 号線無電柱化事業との調整</p> <p>せっかくひろい土地があるので、雑木林でなく人が集えるような場所、明るいものになると体育館がさらにステキなものになると思います。</p>	No.56 をご参照ください。
58	IV. 改修内容について	IV-3 『機能維持・向上工事』の改修内容	<p>総合体育館改修案、拝読させていただきました。幼児から高齢者、障がいのある方に対して心配りのある素敵な体育館に、そして 32 ページ正面イメージ図の様にスッキリとした採光溢れる施設へと景観もすっかり変貌するようで、楽しみでしかありません。</p> <p>一つだけ気になっているのは、体育館前バス停付近を広くしていただきたいです。</p> <p>イベント終了時、三鷹もしくは吉祥寺へ向かうバス待ちの方々がごった返し、歩行者の妨げになります。</p> <p>ご検討お願いします。</p>	No.56 をご参照ください。バス停付近の外構については、ご意見を踏まえ設計段階で検討してまいります。

59	IV. 改修内容について	IV-3 『機能維持・向上工事』の改修内容	P30 外構改修について。現在、体育館の南西の駐輪場に中央通り側から建物の南西回りで出入りすると、見通しが悪く出会い頭の事故につながりかねず、危険だと感じています。事故を防止するための工夫があるとありがたいです。	現在、運用面での対応も検討しておりますが、今回の外構改修においても設計段階でご意見を踏まえ検討してまいります。
60	IV. 改修内容について	IV-3 『機能維持・向上工事』の改修内容	バス通りから体育館敷地に入っすぐのエリアは雨の日はとても滑りやすい。水はけのよい、滑りにくい材質に変えた方がよい。	基本計画「IV-3 『機能向上・向上工事』の改修内容 ③外構改修」に記載されている方針を基に、ご意見を踏まえ、設計段階で検討してまいります。
61	IV. 改修内容について	IV-3 『機能維持・向上工事』の改修内容	31 ページ外構 市道 17 号線からの入口に勾配が無いため雨天時に水溜りになる。また、滑りやすい状態にもなるので改善して欲しい。	No.60 をご参照ください。
62	IV. 改修内容について	IV-3 『機能維持・向上工事』の改修内容	内階段の段差が階によって違う。体力づくりを兼ねてエレベーターを使わず階段を利用しようとする人が増えるような、ゆっくり登れる緩やかで段差が均一な階段だと良い。	保全改修工事の中で階段の構造を大きく変更するのは他室への影響も大きく難しいですが、利便性の高い施設となるようご意見を踏まえ設計段階で検討してまいります。

63	IV. 改修内容について	IV-3 『機能維持・向上工事』の改修内容	それぞれの部屋の入口に靴箱があると良い	現状、靴箱は卓球室、幼児室、4階エレベーターホールに設置しておりますが、その他の箇所に関しては、ご意見を踏まえ設計段階で検討してまいります。
64	IV. 改修内容について	IV-3 『機能維持・向上工事』の改修内容	それぞれの部屋の入口に当日の予定表(どの団体が使うか等)があると良い	現状、予定表を設置しているのは事務所前のみですが、その他の箇所に関しては、ご意見を踏まえ設計段階で検討してまいります。
65	IV. 改修内容について	IV-3 『機能維持・向上工事』の改修内容	冷水機：現在の冷水機は直接飲むタイプだが、エコや衛生上の観点から、マイボトル給水型、もしくは両方が使用できるタイプにしてほしい。	施設機器に対するご意見として承ります。
66	IV. 改修内容について	IV-3 『機能維持・向上工事』の改修内容	サブアリーナ南側壁面に国旗掲揚設備を設置願います。 メインアリーナには国旗や市旗・連盟旗を掲揚できる設備がありますが、サブアリーナには設置されておられません。サブアリーナを利用して大会や講習会を実施する際に、南側に役員席を設置する事が多く現在は壁面のスチール横棒を登り、壁面の横棒に国旗や連盟旗を掲揚しており壁面を登るため滑	現状、簡易的な国旗掲揚設備を設置済ですが、ご意見を踏まえ設計段階で検討してまいります。

			落などの危険を感じております。サブアリーナ南側にメインアリーナ同様の国旗掲揚設備を設置願います。	
67	IV. 改修内容について	IV-3 『機能維持・向上工事』の改修内容	駐輪場を白線などでスペースをわかりやすくして欲しい	現状、プール前の駐輪場には白線を整備しており、その他の箇所については未整備ですが、ご意見として承ります。
68	IV. 改修内容について	IV-3 『機能維持・向上工事』の改修内容	売店が欲しい。ドリンクや補食や、子連れの人が軽く食べられもの、衛生用品など。レジは受付カウンターでも良いので。	運用面を考えると、売店の導入は難しいと考えていますが、ご意見を踏まえ、他の方法（自動販売機の増設等）も含め、今後検討してまいります。
69	IV. 改修内容について	IV-3 『機能維持・向上工事』の改修内容	イベントや大会で1日中体育館を利用をする人にとって食事を調達する手段が少ないので、小さい売店の設置や食品自販機の充実を期待する。	No.68 をご参照ください。
70	IV. 改修内容について	IV-3 『機能維持・向上工事』の改修内容	《飲食》 2階のレストランが撤退して以降、非常に不便である。近隣にもコンビニや飲食店も少ない。	No.68 をご参照ください。
71	IV. 改修内容について	IV-3 『機能維持・向上工事』の改修内容	スペースには余裕があるので、椅子やテーブルを置いて軽食を食べたり、話をしたりお茶を飲んだりする自由に使える場所をもっとたくさん作ってほしい。	1階玄関ホール、2階コミュニティラウンジ、中3階スペース等につい

				て、来館者同士の交流・休憩場所として活用できるスペースとして検討をしてみたいです。ご意見を踏まえ、基本計画「IV-3 『機能維持・向上工事』の改修内容」○「野外活動センター事務所の移設」の記載を修正いたしました。
72	IV. 改修内容について	IV-3 『機能維持・向上工事』の改修内容	喫茶室 談話室について 練習後に、ちょっと休憩したり皆と談話したりできる場所があればと思います。	No.71 をご参照ください。
73	IV. 改修内容について	IV-3 『機能維持・向上工事』の改修内容	3階視聴覚室前のスペースが広いのに特に利用されていないので勿体ないと感じる。談話スペースにしてはどうか。	No.71 をご参照ください。
74	IV. 改修内容について	IV-3 『機能維持・向上工事』の改修内容	8ページII-4 施設の現状にはないが中3階の旧図書コーナーにフリーライミング施設の常設、オリンピック競技にもなっているし設置する施設もおおくなっている。	ご要望の施設は運用面での課題が多く、常設は難しいと考えますが、野外活動センターの2階のコミュニティラウンジへの移設や中3階の来館者の交流スペースとして活用等も含め、有効

				活用できるような検討を設計段階で進めてまいります。ご意見を踏まえ、基本計画「Ⅳ-3 『機能維持・向上工事』の改修内容」○野外活動センター事務所の移設」の記載を修正いたしました。
75	Ⅳ. 改修内容について	Ⅳ-3 『機能維持・向上工事』の改修内容	ダンス室の椅子について椅子を運んだり収納したりするのが高齢者には重いので、練習途中の休憩用としてももう少し軽い椅子にしていただけると嬉しいです。	体育施設の備品に対するご意見として承ります。
76	Ⅳ. 改修内容について	Ⅳ-3 『機能維持・向上工事』の改修内容	雨天時の傘用に、ふりふりするタイプのしずく取りを置いてほしい。	体育施設の備品に対するご意見として承ります。
77	Ⅳ. 改修内容について	Ⅳ-3 『機能維持・向上工事』の改修内容	子どもが市内のバスケット大会に参加した際、アリーナ内の得点操作研修に1日参加しました。もし操作が難しい機械なのであれば当日でも操作可能な簡易なものにして欲しいです。(大会主催者の意図はわからないので、生徒が前日に会場入りし雰囲気慣れておくためかもしれません)	体育機器に対するご意見として承ります。

78	IV. 改修内容について	IV-3 『機能維持・向上工事』の改修内容	<p>その他→今回の改修で幼児室はなくなってしまうか？</p> <p>雨の日など、エネルギーがありあまっている子供が体を動かして遊べる場所としてとても貴重な場所でしたので。</p>	<p>幼児室も改修・補修等を行い、引き続き設置する方針です。</p>
79	IV. 改修内容について	IV-3 『機能維持・向上工事』の改修内容	<p>IV. 改修内容について</p> <p>武蔵野市地域防災計画では、総合体育館は緊急物資輸送拠点として位置づけられているが、そもそもそのことに対応した作りとなっていない。東京都のプッシュ型支援、友好都市からの支援物資等いち早く被災者の手元に届けるため、スムーズな受入れ、仕分け、管理、移送などが必要だ。トラックの出入りの動線が十分に確保されるよう樹木管理も含めて見直しが必要。また、メインアリーナへの搬送もトラック荷台から効率的に運び入れができるよう段差の解消、重量に耐えられる設計が考えられているのだろうか。さらに体育館内の備蓄倉庫は急な階段があり、人力での搬出は困難であろうし中での崩壊も心配される。こちらでもスムーズに搬出できるよう、ボランティアでもわかるよう標示も必要だと考える。防災上の位置づけは、最優先であると考え。運用であるが、有事の際の館内放送では、ぜひ外国人にも配慮したものとしてほしい。</p>	<p>武蔵野市地域防災計画に記載されている災害時の総合体育館の緊急物資輸送拠点やボランティア宿泊施設として位置づけは、今回の大規模改修後も変更はありません。ご意見を踏まえ、基本計画「VI-1 計画上の留意点」に「④災害時の役割について」を追記しました。</p>

80	IV. 改修内容について	IV-3 『機能維持・向上工事』の改修内容	<p>今回の改修案とあまり関係がないかも知れませんが、2階に仮置きされている備品とあるように、倉庫が少ないのかなと思いました。</p> <p>そのせいもあってか、大災害時の際の備品やトイレなど、災害時に総合体育館がどのような役割をこなせるのかが気になりました。</p>	<p>ご指摘のとおり、開館当時に想定していたスポーツ種目以外でも、現在は多様なスポーツを目的として施設が利用されており、必要な備品等が増加している状況です。ご意見を踏まえ、倉庫スペースの検討をまいります。なお、災害時の役割については、No.79をご参照ください。</p>
81	全体、その他	IV-3 『機能維持・向上工事』の改修内容	<p>改修とは少し違うかもしれませんが、トイレにある「靴の上から履くスリッパ」を採用している理由として、「バイ菌の拡大を防ぐため」であるのならば、歩きにくくとても危ないのでトイレの入口に「衛生マット(トイレ用抗菌・防臭タイプ等)」を敷いて対処する方法も、ご検討いただくと良いかと思いました。</p>	<p>外履きでの利用者導線、室内履きでの利用導線が混在しており、これまで衛生マットでの対応も検討いたしましたが、現状は衛生面の観点から靴の上から履くスリッパを採用しています。今後の施設運用に対するご意見として承ります。</p>

82	IV. 改修内容について	IV-3 『機能維持・向上工事』の改修内容	エレベータ横の内階段と2階フロアを繋ぐ扉は、開け閉めの際、扉の向こうの様子が分からないので危ない。扉を無くすかガラス扉にしたほうが良い。	基本計画「IV - 2『改良保全整備』の改修内容④安全性の向上」に記載されている方針を基に、ご意見を踏まえ、設計段階で検討してまいります。
83	IV. 改修内容について	IV-3 『機能維持・向上工事』の改修内容	サブアリーナから直接観覧席に上がることができるかと便利である。	本工事は保全改修のためご要望に応えることは難しいと考えていますが、今後の施設整備に関するご意見として承ります。
84	IV. 改修内容について	IV-3 『機能維持・向上工事』の改修内容	サブアリーナの観覧席は、段差が大きく柵も無いので小さな子供（アリーナで体操などを行っている子供の弟妹）の安全確保に保護者が苦勞している。メインアリーナ同様の椅子型の観覧席の方が危険が少ないと思う。	No.82 をご参照ください。
85	IV. 改修内容について	IV-3 『機能維持・向上工事』の改修内容	子どもがまだ小さい頃は幼児教室が体育館で行われていても交通の便が悪い、設備が子連れ対応でない等の理由からなかなか参加できませんでした。今後改修工事をしてわざわざでも行きたくなるような施設になればいいなと思います。子ども本人も幼児の頃から行きなれた場所であれば、中学生・高校生になっても友達同士で利用できると思います。	ご意見として承ります。

86	IV. 改修内容について	IV-3 『機能維持・向上工事』の改修内容	3階の体協ミーティングルームは一般市民は使用しないので、エアコンは独立型にした方が、事業団や電気室の手を煩わせなくて済む。	ご指摘ありがとうございます。 ご意見として承ります。
87	IV. 改修内容について	IV-3 『機能維持・向上工事』の改修内容	3階の給湯室を一般の人が利用しているのを見かける、熱湯が出るので、扉を設けるなど一般の人が自由に立ち入れないようにした方が安心である。	ご指摘ありがとうございます。 ご意見として承ります。
88	IV. 改修内容について	IV-3 『機能維持・向上工事』の改修内容	3階のスタンド側窓の淵にある鳩除けに夏場にセミが刺さっていて割とシュール	ご指摘ありがとうございます。 ご意見として承ります。
89	IV. 改修内容について	IV-4 各諸室の改修内容	全体的に他市の体育館などと比較して見劣りすることが多いと感じる。	ご意見を踏まえ、今後も市民のスポーツ文化の発展に寄与していく施設となるよう改修を進めてまいります。
90	IV. 改修内容について	IV-4 各諸室の改修内容	サブアリーナへもっと分かりやすく行ける階段を作ったら喜ばれると思います。もう1つ2階か3階か？になる吹き抜け渡る所を運動が出来る第3アリーナに造り変えるはどうか？	No.83 をご参照ください。
91	IV. 改修内容について	IV-4 各諸室の改修内容	【各諸室の改修内容（事務室等）】 事務室等の職場環境に関して、働く人にとっても良い施設となるように安全衛生上の広さ・照度等を確保することはもちろんのこと、運営時の施設利用者の怪我や事故に迅速に対応できるとともに、災	ご意見を踏まえ設計段階で検討してまいります。

			<p>害発生時の要として初動対応ができる環境を整える必要があります。事務所内の空間の確保、スタッフの更衣室や休憩スペース、簡単な打ち合わせスペース、ビルメンテナンス・清掃員・警備員の方々の詰め所などにも十分な配慮をお願いします。</p> <p>計画案に記載のとおり、情報セキュリティの観点からも文書保管スペースも重要です。また、スポーツ施設という特性を考慮し、備品の置き場などのバックヤードについても、空きスペースを活用するなどにより、できうる限り確保してください。</p>	
92	IV. 改修内容について	IV-4 各諸室の改修内容	<p>【各諸室の改修内容（野外活動センターの移設）】</p> <p>武蔵野市民緑の憲章には、人間と自然との調和のないところに、あかるい市民生活はない、と記述があります。武蔵野市は都市に位置しており、消費社会として資源、食糧、エネルギー、ごみ処理から汚水処理などを地方をはじめとする他自治体に依存しています。都市は単立できないからこそ、自然の大切さを学ぶ必要があります。野外活動センターはその役割を担っていると認識しています。野外活動センターがその機能を発揮できるよう、諸室の再整備をお願いします。</p>	ご意見を踏まえ設計段階で検討してまいります。

93	IV. 改修内容について	IV-4 各諸室の改修内容	<p>【各諸室の改修内容（多目的化）】</p> <p>軽体操・ダンス室、視聴覚室、大会議室の内装改修にあわせて、多様なスポーツへ対応できるように、ICT機器、音響機器を更新していただきたい。また、軽体操・ダンス室の稼働率が高い一方で、視聴覚室や大会議室の稼働率が低いため、鏡の設置、床素材の工夫、可動壁による開放感の創出等を検討してください。</p>	ご意見を踏まえ設計段階で検討してまいります。
94	IV. 改修内容について	IV-4 各諸室の改修内容	IV-4 31 ページ外構 市道 17 号線から体育館入り口にかけての雨天時の水溜り対策	No.60 をご参照ください。
95	IV. 改修内容について	IV-4 各諸室の改修内容	IV-4 31 ページ外構 障害者、高齢者の来館や荷物の搬入等のために、市道 17 号線から正面入り口付近に車寄せが設置されれば利便性が向上すると思います。（長時間駐車禁止）	No.60 をご参照ください。
96	IV. 改修内容について	IV-4 各諸室の改修内容	改修計画にはないが体育館3階の陸上競技場用の特別観覧席の有効利用を考えたらいかがですか。	ご指摘ありがとうございます。ご意見として承ります。
97	IV. 改修内容について	IV-4 各諸室の改修内容	<p>武蔵野総合体育館大規模改修保全整備基本計画（案）を読ませていただきました。</p> <p>とてもよく練られていると思いました。</p> <p>【IV-4 各諸室の改修内容】</p> <p>確かに利用していて、場内(ダンス室)が薄暗く感じることもありましたが、夏でも冷房が弱いなど感じる、老朽化して壊れている仕切壁もあつたりで、不便だと感じ</p>	ご指摘ありがとうございます。No.36 をご参照ください。

			<p>ることがありました。また、エレベーターがどこにあるのかも迷いました。</p> <p>最新の機器や LED ライト等に変えることで、少しでも省エネ・節税に繋がるのであれば、結果的に市民にも喜ばしいことではないでしょうか。</p> <p>また、表示サインが導入されれば、初めて利用する人にとっても迷うというストレスがなくなり、より一層利用しやすい場になると思います。その点が計画案にはすべて組み込まれていたもので、利用してもらう側だけでなく、利用する側にもプラスになる案だと思いました。</p>	
98	IV. 改修内容について	IV-4 各諸室の改修内容	<p>【1 F 幼児室】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 2 F の親子スペースと抱き合わせで機能・役割分担などが考えられませんか？ 2 F の親子スペースの 1 F への統合など、他市の施設をベンチマークしたこうした施設（幼児のあそび場、親子コミュニケーション）スペースの高度化・複合化等の工夫がなされても良いのでは？ <p>※受付カウンタースペースの前出しによる一次コンタクト UP は OK</p> <p>※前述に伴う 1 F 更衣室とトイレの拡充・レイアウト変更は OK</p>	1 階幼児室については、改修・補修等を行い、引き続き設置する方針です。その他のスペースの活用については、No.71 をご参照ください。
99	IV. 改修内容について	IV-4 各諸室の改修内容	<p>【2 F】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 逆に 2 F に 1 F の幼児室機能を持ってくるのもアイデアでは（2 F 親子広場のふれあい・コミュニ 	No.71 をご参照ください。

			<p>ケーション機能UP)</p> <p>※野外活動センターとの絡みで近くに施設があった方が・・・？</p> <ul style="list-style-type: none"> ・廊下後側の更衣室とトイレのレイアウトが現状、動線的にも自然で無いように思います。(1F同様のレイアウト改善・アメニティ向上、不自然は善暗さが原因?) <p>※野外活動センターの移動はOK (サービスUP)</p>	
100	IV. 改修内容について	IV-4 各諸室の改修内容	<p>【M3F (休憩・歓談スペース)】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・このスペースに係る記載情報がありませんが、特段のアイデアを持っておりませんが、現状では宝の持ち腐れ状態のように思います。折角のスペースですので動線などの観点からまた使い方を含む当該スポーツ施設の意義やコンセプトの観点からスペース・バージョンアップの工夫を期待しております。 	No.71 をご参照ください。
101	IV. 改修内容について	IV-4 各諸室の改修内容	<p>【3F】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・他フロアもそうですが、サインの改善 (既述)、動線を念頭に野外活動センターが2Fに降りることもあり、3Fのレイアウト変更もありではないでしょうか？ (使用者の声や要望は?) ・エレベータからサブアリーナ観覧席へのアクセスする途中の床鳴りが気になります。 	3階フロアについては、野外活動センターが2階へ移設することに伴い、書庫スペースの増設や、内装改修による交流スペースの充実を検討してまいります。床の改修については、ご意見を踏まえ、設計段階で検討してまいります。

102	IV. 改修内容について	IV-4 各諸室の改修内容	<p>【4F】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・柔剣道場（特に剣道使用時）の発する音、振動が3Fでとても気になります。振動・遮音・防音等、床の改善検討が必要ではないでしょうか？（使用者からの苦情は？） ・2F同様に更衣室とトイレのレイアウトが自然で無いようです。明るさ、動線を含めて確認・工夫をお願いします。 	<p>音や振動に関しては、改善策について、ご意見を踏まえ設計段階で検討してまいります。</p> <p>4階の更衣室とトイレに関しても、ご意見を踏まえ設計段階で検討してまいります。</p>
103	V. 今後のスケジュール	V-1 設計及び工事スケジュール	<p>現状の様々な課題に対し、「劣化保全整備」「改良保全整備」「機能維持・向上工事」と必要最低限の工事であるようですので、一年間近く休館するのでもったいないような気もしますが、市財政を勘案するとこれぐらいではしょうがないのでしょうかね。</p>	<p>今回の保全改修工事は、今後30年程度引き続き施設を使用していくために必要不可欠な設備機器等を更新するものであるため、ある一定期間は休館せざるを得ません。</p> <p>なお、詳細な休館期間に関しては、ご意見を踏まえ設計段階で検討してまいります。</p>
104	V. 今後のスケジュール	V-2 全館休館期間	<p>当連盟の活動は主に2種類に分けられます。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 一般の方々が活動する通常のサークル活動 2) 当連盟が主導する大規模イベント等の活動 <p>です。</p>	<p>No.103をご参照ください。</p> <p>なお、工事期間中の代替施設につきましては、ご意見を踏ま</p>

		<p>1) は健康づくり、仲間づくりを中心としたグループから、中国武術の本質を求める研修的グループまで、様々な内容と多種多様な流派の団体が活動しています。その多くのグループが総合体育館を利用させていただいております。</p> <p>2) は春秋の市民体育祭・大会、新年には初稽古等の大人数参加型のイベントと、指導員勉強会、技能検定試験と勉強会等、必要性に応じたイベント。これらは全てを総合体育館をお借りして行っております。</p> <p>このような現状であることから、総合体育館の改修中の活動が大幅に制限されることは明白です。</p> <p>コロナ禍以来、現在にいたってもなお、学校開放も進んでおらず、コミセンの利用もどこも既に満杯状況がほとんどで、改修期間中の会場確保は今まで以上に困難を極めることが明らかでしょう。</p> <p>改修基本計画（案）が12月15日号の市報に掲載されてから、当連盟でも会員各位から事務局に宛てて、多くの不安な心情や要望が寄せられています。当連盟そのものの存続すら危ぶまれるという意見すらあり、憂慮しているところです。</p> <p>1) 各サークル活動については、</p> <ul style="list-style-type: none"> ・総合体育館と同等は無理としても、どこかに代替となる簡易会場が少しでも確保できないか。 ・学校や幼稚園の空き教室、空き 	<p>え、検討してまいります。</p>
--	--	--	---------------------

			<p>日程等の貸出しを行政で手助けして貰えないか。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・近隣の市や区との会場の提携・連携ができるような仕組みを検討してもらえないか。 ・民間の会場を利用できるよう、補助を願えないか。 <p>2) 大型イベントに関しては、</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コロナ禍の期間と同じと考えれば、1、2年は中止・延期でしのげるか。 ・学校の体育館等の大きな会場を使わせてもらうことはできるか。などの意見が出ております。 <p>スポーツも種類によって異なると思いますが、当連盟の活動に参加している方のほとんどは健康づくりを自ら進んで実践している方々であり、そのことで市政・市の予算へ貢献しているものと自負しております。</p> <p>どうか、改修期間においても、少しでも当連盟の活動が続けられるような方法をご検討いただけますよう、要望いたします。</p>	
105	V. 今後のスケジュール	V-2 全館休館期間	<p>工事スケジュールに対するご意見です。</p> <p>頻繁にダンス室を利用させていただいています。健康維持する為に活動を止めたくない為、工事期間中の休館期間をなるべく短くして欲しいことと、工事の間に代わりに使用出来る施設をダンス室と同じくらいの使用料で使わせて欲しいです。</p>	No.104 をご参照ください。

106	V. 今後のスケジュール	V-2 全館 休館期間	<p>●工事期間中が1年半ほどすべての施設が使用できない件に関して体育館の施設を団体として借りて利用しています。</p> <p>この期間体育館の会場を使用できないとなると、他の会場の確保をする必要が出てきます。</p> <p>ただでさえ他の団体の方々との譲り合いで希望の日時を今でもすべて確保できない状況の中、体育館を使用できないという事であれば、運動する機会を失い活動も休止、もしくは解散に追い込まれてしまいます。</p> <p>コロナ禍で体育館が使用停止になり再開するまでの間に多くの方が運動をやめてしまった経緯もあります。</p> <p>特に私が所属している太極拳は高齢の方も楽しみながら活動しており、コロナ禍で体育館が使えなくなった後は外出するのも面倒になり、やめて行ってしまった人が多数出ました。健康のためにも継続できる方法はないのか？という事が課題です。</p> <p>生涯スポーツ課の講習会は他の施設を借りて開催されるようですが、常に今まで体育館を使用して運動をしていた人たちもたくさんいます。</p> <p>その活動をやめることなく続けられるよう、代替えの施設を用意していただき、活動ができるような配慮をお願いしたいと思います。</p>	No.104 をご参照ください。
-----	--------------	----------------	--	------------------

107	V. 今後のスケジュール	V-2 全館 休館期間	<p>体育館は開設以来利用させていただき感謝しております。又保全のための改修にも感謝しております。</p> <p>私が問題視するのは休館期間と休館方法です。1年以上の全面休館は体育館を利用する団体の死活問題であると思います。コロナ禍の活動休止によってもういいやとリタイアする方が多く見られます。</p> <p>そこで、提案ですが、体育館をいくつかのブロックに分け、ブロック毎に工事を行い、ブロック毎に閉鎖し他の部分は使用可とする計画で工事を進める事が出来ないでしょうか。メインアリーナとサブアリーナを同時に閉鎖する必要は無いと思います。ダンス室、卓球室等他の設備会場も同様です。工事期間中の部分使用に当たってはトイレとか色々不便が生じることは利用者也理解すると思います。</p> <p>どうしても全面休館しか出来ない場合は、市民のスポーツを大切に考える市役所としては期間中の代替設備を用意すべきだと思います。</p> <p>具体的には大変かも知れませんが学校の体育館の利用拡大、民間設備の借り上げなどです。</p> <p>どうかスポーツを楽しむ、スポーツで健康を維持する市民のために、特に高齢者の活動のために基本計画（全面休館）の見直しをお願い致します。工事期間が延びることは致し方ないと思います。</p>	No.104 をご参照ください。
-----	--------------	----------------	---	------------------

108	VI. 計画上の留意点について	VI-1 計画上の留意点	<p>基本計画に、防災の視点が欠落している。</p> <p>総合体育館は、地域防災計画において、拠点備蓄倉庫（P435）であり、非常災害時には緊急物資輸送拠点（P436）となることから、建物が損傷しインフラが途絶した最悪の状況下でも防災機能を維持できるための改良が必要である。</p> <p>以下提案する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地下に備蓄している物資を効率よく人力で運搬できるよう、地下から1階まで台車が通れる幅と傾斜のスロープを設置するべきである。 ・1階では、物資を輸送車等から搬出入するときの動線と利便性の確保が必要である。 ・電気は、クリーンセンターから供給されているが、焼却炉が損壊し送電が停止することを見据え、創電のための太陽光パネルと蓄電設備等の整備を検討されたい。 ・トイレの改修に合わせ、断水時にプール水等で水を流せるよう、トイレへの取水口の設置を検討されたい ・総合体育館の階段室は、一般の方からはわかりづらいため、非常口表示器に加え、床面に赤色等で避難経路のサイン化を検討されたい。 ・また、この規模の建物にエレベータ1基はあまりにも貧弱であ 	<p>No.79 をご参照ください。</p> <p>なお、ご指摘いただいた点につきましては、サインのリニューアルやエレベーターの改修等に加え、運用面での検討も含め、ご意見を踏まえ設計段階で検討してまいります。</p>
-----	-----------------	--------------	--	--

			る。外付けも含め北ウイング側に、ストレッチャー収納可能なエレベータの設置を検討されたい。	
109	Ⅵ. 計画上の留意点について	Ⅵ-1 計画上の留意点	p.37 Ⅵ. 計画上の留意点について Ⅵ-1 計画上の留意点 ②事務受付機能の継続 について。 コミセンの体育室では定期的に活動をしているサークルがあります。自分が関わっているコミセンでは平日の朝～昼過ぎにかけて定期的に活動しているサークルが多く、利用申し込み開始日の朝イチに予約に来る熱心なサークルがほとんどです。できれば、そのような利用者にも配慮した事業運営(例えば午後や夜間の時間帯にスポーツ教室を行うなど)をお願いします。特に夜間は利用者も少ないため、学生や社会人向けのスポーツ教室などを開催していただけると、お互い win-win になるのではないかと思います。	施設運営に対するご意見として承ります。
110	Ⅵ. 計画上の留意点について	Ⅵ-1 計画上の留意点	人的対応が人によって差が大きい。ハードだけでなく、「運営面」等ソフトについても、利便性、親和性を基準に「改修」していただきたい。	ご指摘ありがとうございます。ご意見として承ります。
111	Ⅵ. 計画上の留意点について	Ⅵ-1 計画上の留意点	○留意点 長期間にわたる施設の閉館はしかたないと思いますが、陸上競技場の更衣室や四中体育館など可能な範囲で代替していただくようお願いします。	No.104 をご参照ください。
112	全体、その他	その他	《所感》 ■改修保全を前提とはいえ、中央地区でのスポーツ施設機能の充実	ご指摘ありがとうございます。

			<p>化を図ることは、話題性と連動して遠隔地の市民にとってアクセス面で大きな不満を持つことになるのではないのでしょうか。市内の施設機能の棲み分けなど、きちんと考え方を明確にして広報活動していく必要があるかと思います。</p> <p>■直接的に問題になっているのか（なるのか）現時点（過去の推移データから）での実態が判らないので何とも言えませんが、市民と市外者の使用上の問題（施設予約の容易性などを踏まえた市民優先の考え方）も前者同様にきちんと整理しておく必要があるかと思います。多額の市税投入事業であり、姿勢・考え方に関する広報をお願いします。</p>	<p>ご意見として承ります。</p>
113	全体、その他	その他	<p>総合体育館大規模改修についての意見ですが、計画書に有る問題点、改修ポイントを支持致しますが、最終的には、新築するのが資金効率的に良いと以前から考えて居ります。</p> <p>本大規模改修が承認され、実行された後は、次回の改修又は新築に向けて積立金が出る様な方策を考えるべきだと思います。一例としては、墨田区の体育館は入口からスポーツメーカーののぼり旗が群立し、体育館内部の2階手摺りにも各スポーツメーカーの横断幕がここぞ狭しと掲示されています。当然、広告料収入が有ると思います。市のスポーツ施設も改修等の費用を税収だけに頼るのでは</p>	<p>ご指摘ありがとうございます。ご意見として承ります。</p>

			無く、一部でも、収益を上げ、そこから捻出出来る様なシステムを考えていかなければならないと考えて居ります。	
114	IV. 改修内容について	その他	バドミントン備品：バドミントンネットをヒモで結ぶタイプではなくマジックテープ式に、ポールも力が必要なくネットが張れるタイプにしてもらえると高齢者や子供にもセットしやすい（現在、係の方が用意してくれるが、簡易な状態なので、自分たちでヒモを結んだりネットを張り直している）	ご指摘ありがとうございます。ご意見として承ります。
115	全体、その他	その他	こういったアンケートを、ジムやその他の利用者に直接渡してその場で書いてもらおうと生きた意見が聞けて良いと思います。	今後の体育施設の運営に対するご意見として承ります。
116	全体、その他	その他	論点はズレますが…。大きなフロアが総合体育館に限られている。総合体育館だけでなく、市内中高大との連携による体育館利用拡大を検討していただきたい。	今後の市の体育施設整備の方針に対するご意見として承ります。
117	全体、その他	その他	今後の地球温暖化を見据えて、真夏でも快適に運動できる空調となるとありがたいです。	基本計画「IV - 1『劣化保全整備』の改修内容②機械設備の保全」に記載されている方針を基に、空調設備の更新を行います。ご意見を踏まえ、設計段階で検討してまいります。

118	全体、その他	その他	陸上競技場スタンドと一体化したあたたかい感じの2階デッキとなるといいです。	ご意見を踏まえ、設計段階で検討してまいります。
119	全体、その他	その他	市民以外が利用する場合の料金については、場所柄市民の税金を使って運営している以上、もっと市民との料金差をつけるべきだと思います。	体育施設の使用料金に対するご意見として承ります。
120	全体、その他	その他	トレーニング室の利用について。現在は市民カード以外に専用の登録カードが必要でしかも人を介してカードを預ける・番号を告げて回収する要領になっている。非常に前時代的なオペレーションであり、市民カードに統一や電子化などによる利便性の向上が必須だと考える。	施設利用に対するご意見として承ります。ご意見を踏まえ、利便性の高い運用を検討してまいります。
121	全体、その他	その他	利用料金について。しばらく前から電子マネー対応を謳っているが、実情はお粗末で窓口で係員とやりとりする必要があり、煩雑で時間もかかる。街頭の自動販売機ですら対応しているのだから、券売機を電子マネー対応にするのは当然だと考える。	No.120 をご参照ください。
122	IV. 改修内容について	その他	スポーツをする人が利用する場所なので、ウェアやシューズ、靴下などを販売すれば収益になると思う。	運用面を考えると、売店の導入は難しいと考えていますが、他の方法（自動販売機の設置等）も含め、ご意見として承ります。

武蔵野総合体育館大規模改修保全整備基本計画

令和6年3月

発行 武蔵野市教育委員会生涯学習スポーツ課
所在地 〒180-8777 武蔵野市緑町 2-2-28
電話 0422-60-1903 FAX 0422-51-9264
E-mail SEC-SYOUNGAKU@city.musashino.lg.jp
